



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

---

*Утверждено решением коллегии  
КСП Иркутской области  
№ 2(561)/4р-КСП от 16.02.2024*

### **Заключение № 12/4-ЭАМ**

#### **о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области за январь-декабрь 2023 года»**

16.02.2024

г. Иркутск

1. Основание для проведения мероприятия: п. 21 раздела III Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области на 2024 год.

2. Предмет мероприятия: отчетность об исполнении областного бюджета Иркутской области; данные ГИС «Электронный бюджет»; данные, размещенные на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

3. Объекты мероприятия: органы исполнительной власти Иркутской области (по запросу).

4. Цель мероприятия: оперативный анализ реализации региональных проектов Иркутской области в 2023 году.

Вопросы мероприятия:

4.1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по реализации национальных (региональных) проектов.

4.2. Общий анализ участия Иркутской области в реализации национальных проектах.

4.3. Анализ финансового обеспечения мероприятий на реализацию региональных проектов Иркутской области.

4.4. Анализ исполнения расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов за отчетный период. Причины неисполнения мероприятий региональных проектов.

4.5. Анализ информации о реализации проектов, содержащий, в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, сведений о возможных рисках недостижения показателей.

4.6. Оценка выявленных, вероятных и условных признаков нарушений по контрактам заключенным в рамках региональных проектов по данным модуля «Риск-Мониторинг» Единой информационной системы в сфере закупок.

4.7. Нарушения, выявленные в ходе исполнения региональных проектов контролирующими органами в части бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.

5. Анализируемый период: январь-декабрь 2023 года.

6. Сроки проведения мероприятия: 1 квартал 2024 года.

Информация подготовлена на основании результатов оперативного анализа

исполнения и контроля за организацией исполнения областного бюджета и консолидированного бюджета Иркутской области по состоянию на 01.01.2024.

## **Результаты экспертно-аналитического мероприятия:**

### **1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по реализации национальных (региональных) проектов**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поручено обеспечить достижение национальных целей, в соответствии с которыми разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ национальные проекты (программы).

Положение об организации проектной деятельности в Правительстве РФ утверждено постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (далее – Постановление № 1288).

Согласно п. 3 Постановления № 1288, обеспечение достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнения задач национальных проектов (далее – НП) осуществляется посредством исполнения федеральных проектов (далее – ФП).

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года утвержден распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р и сформирован в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и определяет стратегические приоритеты Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей развития и целевых показателей, характеризующих их достижение, на ближайшие 10 лет.

Законом Иркутской области от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области» определены участники, документы, а также стратегический совет Иркутской области.

Пунктом 2 Постановления № 1288 органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовать проектную деятельность, руководствуясь положениями данного постановления.

Положение об организации проектной деятельности в Иркутской области (далее – Положение) утверждено постановлением Правительства Иркутской от 03.06.2019 № 440-пп (утратило силу с 10.01.2022), Указом Губернатора Иркутской области от 10.01.2022 № 5-уг, с 25.09.2023 действует новая редакция Указа 5-уг.

Реализация региональных проектов является основой достижения целей стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10.01.2022 № 15-ОЗ.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 12.06.2021 № Пр-1006 по итогам заседания Российского комитета «Победа» в рамках РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» продолжается работа по созданию электронных Книг памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации с целью увековечения памяти погибших при защите Отечества. В адрес Министерства обороны Российской Федерации направлена информация по 16 муниципальным образованиям.

Перечнем поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, утвержденным Президентом РФ 26.01.2023 № Пр-144 (далее – Перечень поручений), даны поручения Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на

период до 2030 года уделить особое внимание решению ключевых задач, достижению целей и целевых показателей в 2023 году, принять меры по оперативному перераспределению межбюджетных трансфертов. При этом на уровне Иркутской области в целях исполнения данного Перечня поручений не разработаны правоустанавливающие документы.

В целях реализации задачи по повышению благосостояния граждан Российской Федерации и достижения целей снижения уровня бедности и неравенства населения по доходам, предусмотренных Перечнем поручений, в Иркутской области принято распоряжение Губернатора Иркутской области «О реализации мероприятий, направленных на снижение уровня бедности в Иркутской области» от 06.03.2023 № 65-р.

Кроме того, на территории Иркутской области в 2023 году действовали следующие правовые акты:

1. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 11.02.2021 № 37-р «О рабочей группе по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на территории Иркутской области». Данным распоряжением создана рабочая группа по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на территории Иркутской области, утвержден ее состав. Несмотря на отраженные замечания о неактуальности состава данной рабочей группы в отчете КСП области от 27.12.2022 № 12/37-ЭАМ о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ участия Иркутской области в реализации федеральных программ, национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов в 2021 году», в распоряжение изменения не вносились (действует по настоящее время).

2. Указ Губернатора Иркутской области от 15.09.2021 № 252-уг «О Координационном совете по реализации национальных проектов на территории Иркутской области при Губернаторе Иркутской области». Данным Указом образован Координационный совет по реализации национальных проектов на территории Иркутской области при Губернаторе Иркутской области, определены задачи, функции, права совета, состав, структура и организация работы совета (утратил силу 23.10.2023 в связи изданием Указа Губернатора Иркутской области №353-уг).

3. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 24.11.2021 № 363-р «Об утверждении состава Координационного совета по реализации национальных проектов на территории Иркутской области». Данным распоряжением утвержден состав Координационного совета по реализации национальных проектов на территории Иркутской области при Губернаторе Иркутской области (утратил силу 23.10.2023 в связи изданием Распоряжения Губернатора Иркутской области №342-р).

Правительством РФ утвержден план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года (Распоряжение от 16.10.2023 №2846-р). Документ включает свыше 150 мероприятий, сгруппированных в рамках нескольких направлений. Их реализация создаст условия для экономического развития регионов и появления новых рабочих мест, что в свою очередь даст возможность повысить уровень жизни людей. Так, для Иркутской области были выделены следующие мероприятия по направлениям:

1. Повышение качества жизни (мероприятия, направленные на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - национальные цели развития): «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»,

«Комфортная и безопасная среда для жизни», «Возможности для самореализации и развития талантов»).

Жилищно-коммунальное хозяйство:

Перевод системы теплоснабжения г. Байкальска на электроотопление в срок до 2029 года.

Завершение переходного периода ценовой зоны теплоснабжения г. Усолье-Сибирское Иркутской области до конца 2023 года.

Экология и окружающая среда:

Создание экотехнопарка «Восточная Сибирь» (г. Усолье-Сибирское Иркутской области) до 2030 года.

Ликвидация накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Ликвидация накопленного экологического вреда в результате производства химической продукции в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

Подготовка предложений по совершенствованию и развитию мер по охране озера Байкал по результатам экологического мониторинга.

2. Развитие науки и образования, кадровое обеспечение (мероприятия, направленные на достижение национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»):

Наука и инновации:

Создание инновационной образовательной среды (кампусов) ввод в эксплуатацию кампусов в г. Томске и г. Новосибирске. Подача заявок проектов кампусов в г. Иркутске, г. Горно-Алтайске, г. Кемерово в целях участия в процедуре отбора проектов по созданию кампусов.

Создание федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское создание новых высокотехнологичных производств малотоннажной и среднетоннажной химии, поликремния. Привлечение 830 млрд. р. внебюджетных инвестиций.

3. Инфраструктурное развитие (мероприятия, направленные на достижение национальных целей развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»):

Аэропорты и воздушные пункты пропуска:

Реконструкция аэропортового комплекса г. Усть-Кута Иркутской области, увеличение пропускной способности аэропорта г. Усть-Кута до 0,2 млн. пассажиров в год до 2030 года.

Реконструкция аэропортового комплекса г. Братска Иркутской области до 2024 года.

Реконструкция плоскостных сооружений аэродромных комплексов аэропортов местных воздушных линий г. Киренск и села Ербогачен Иркутской области до 2027 года.

Строительство аэропортового комплекса Бодайбо Иркутской области до 2025 года.

Реконструкция и строительство аэропорта г. Иркутска до 2030 года.

Доведение посадочной площадки до статуса аэропорта в г. Усть-Илимске до 2024 года.

Строительство аэропорта Тайшет (Шелехово) на территории Тайшетского района Иркутской области до 2035.

Автомобильные дороги, пункты пропуска, транспортные коридоры, мосты:

Проработка вопроса строительства автомобильной дороги «Южный обход города Иркутска» до 2030 года.

Подготовка предложений по реконструкции автомобильной дороги Баяндай - Еланцы - Хужир - на участке км 124 + 332 - км 153 + 932 в Ольхонском районе Иркутской области 2030 года.

Подготовка предложения по строительству автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции до 2025 года.

Железные дороги и водные пути:

Реализация мероприятий по развитию магистральной электрической сети, предусмотренных комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р.

Проработка вопроса создания портово-логистического кластера в г. Усть-Кут Иркутской области до 2035 года.

Реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутске до 2024 года.

Газификация:

Определение перспективных объемов потребления природного газа промышленными потребителями (1 этап - потребители, расположенные вблизи городов Ачинск, Красноярск, Канск, **Саянск, Ангарск, Иркутск**; 2 этап - все потребители на территории Сибирского федерального округа) до 2024 года.

Инвентаризация домовладений граждан в целях возможности их газификации за счет сетевого газа (1 этап - потребители, расположенные вблизи городов Ачинск, Красноярск, Канск, **Саянск, Ангарск, Иркутск**; 2 этап - все потребители на территории Сибирского федерального округа) до 2024 года.

Программы развития отдельных регионов:

Реализация программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года (увеличение численности населения г. Байкальска в 2030 году до 17 тыс. человек, создание 3,3 тыс. новых рабочих мест).

Стратегия содержит раздел «Кластерное развитие» по направлению «Лес, лесопереработка и лесохимия» для Иркутской области определен приоритетный инвестиционный проект Модернизация производства акционерного общества «Группа Илим» в Иркутской области до 2025 года. По направлению «Переработка алюминия» определены приоритетные инвестиционные проекты «Экологическая модернизация Братского алюминиевого завода» до 2031, «Создание Тайшетской Анодной Фабрики» до 2030 года и «Создание Тайшетского алюминиевого завода» до 2030 года.

По направлению «Драгоценные металлы» определены приоритетные инвестиционные проекты «Разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог» до 2028 года, «Разработка месторождения рудного золота «Гурбей» до 2035 года, «Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении «Светловское» до 2037 года, «Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината «Красный» до 2037 года. В рамках реализации проектов определены обеспечивающие мероприятия «Строительство мостового перехода через реку Витим», «Капитальный ремонт мостового перехода через реку Бодайбо», «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на маршруте Таксимо - Бодайбо - Кропоткин», «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Нижнеудинск - Гурбей» и «Подготовка и направление ходатайства о переводе земельного участка месторождений Гурбей и Светино из лесного фонда в категорию земель промышленности в целях строительства золотоизвлекательной фабрики».

По направлению «Цветные и редкоземельные металлы» определен приоритетный инвестиционный проект «Промышленная разработка Зашихинского редкометалльного месторождения» до 2028 года.

По направлению «Туризм» определены приоритетные инвестиционные проекты «Комплексный туристический проект "Байкальская слобода", 3500 номеров, Иркутская область, Иркутский район» до 2035 года, «Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала"» до 2028 года, «Комплексный проект развития исторического центра города "Иркутские кварталы" (г. Иркутск)» до 2030 года, «Комплексный туристический проект "Зеленый мыс", 304 номеров, Иркутская область, Иркутский район» до 2028 года, «Создание Международного центра водных ресурсов» до 2026 года, «Комплексный туристический проект "Многофункциональный комплекс Сибэкспоцентр"» до 2026 года.

По направлению «Сельское хозяйство и пищевая промышленность» определены приоритетные инвестиционные проекты «Организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зелени в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) (тепличный комплекс г. Саянск)» до 2026 года, «Модернизация мясоперерабатывающего комплекса» до 2023 года и «Строительство и дальнейшая эксплуатация линейного элеватора мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения и развитие контрактного производства зерновых, зернобобовых и масличных культур» до 2026 года.

По направлению «Нефть и газ» определены приоритетные инвестиционные проекты «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» до 2024 года, «Создание газохимического комплекса в районе г. Усть-Кут (Строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (завода фракционирования широкой фракции легких углеводородов) в районе Толстого мыса г. Усть-Кута, Строительство завода полимеров, Усть-Кутский комплекс глубокой переработки углеводородов)» до 2035 года, «Полномасштабная разработка Верхнечонского месторождения, Катангский район» до 2050 года, «Разработка Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения» до 2050 года и «Модернизация нефтехимического производства, г. Ангарск» до 2024 года.

Также определен перечень проектов в социальной сфере, учитываемых в приоритетном порядке при принятии президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации решений в соответствии с пунктом 121 Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2016 г. № 451 «О Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» для Иркутской области определены такие объекты как:

- приемное отделение со стационарным отделением скорой помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница»;

- акушерский реанимационный корпус областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братский перинатальный центр»;

- радиологический корпус Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске;

- филиал поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница № 1" на 1000 посещений в смену в г. Иркутске;

- стационар на 436 коек государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская государственная областная детская клиническая больница»;


- подготовка необходимой документации для строительства спортивного зала «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва»;

- подготовка необходимой документации для строительства спортивного комплекса с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром;

- реконструкция с элементами реставрации объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13, с его приспособлением для использования государственным автономным учреждением культуры «Иркутский областной Театр Юного Зрителя им. А. Вампилова».

## 2. Общий анализ участия Иркутской области в реализации национальных проектов

По объему средств бюджетов всех уровней, предусмотренных на 2023 год на реализацию национальных проектов (далее – НП), Иркутская область (37 331,9 млн. р.) занимает 2 место среди субъектов Сибирского федерального округа (далее – СФО) (233 053,7 млн. р.). Планируемый и исполненный объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию НП, по состоянию на 01.01.2024 по СФО отражен на рисунке.

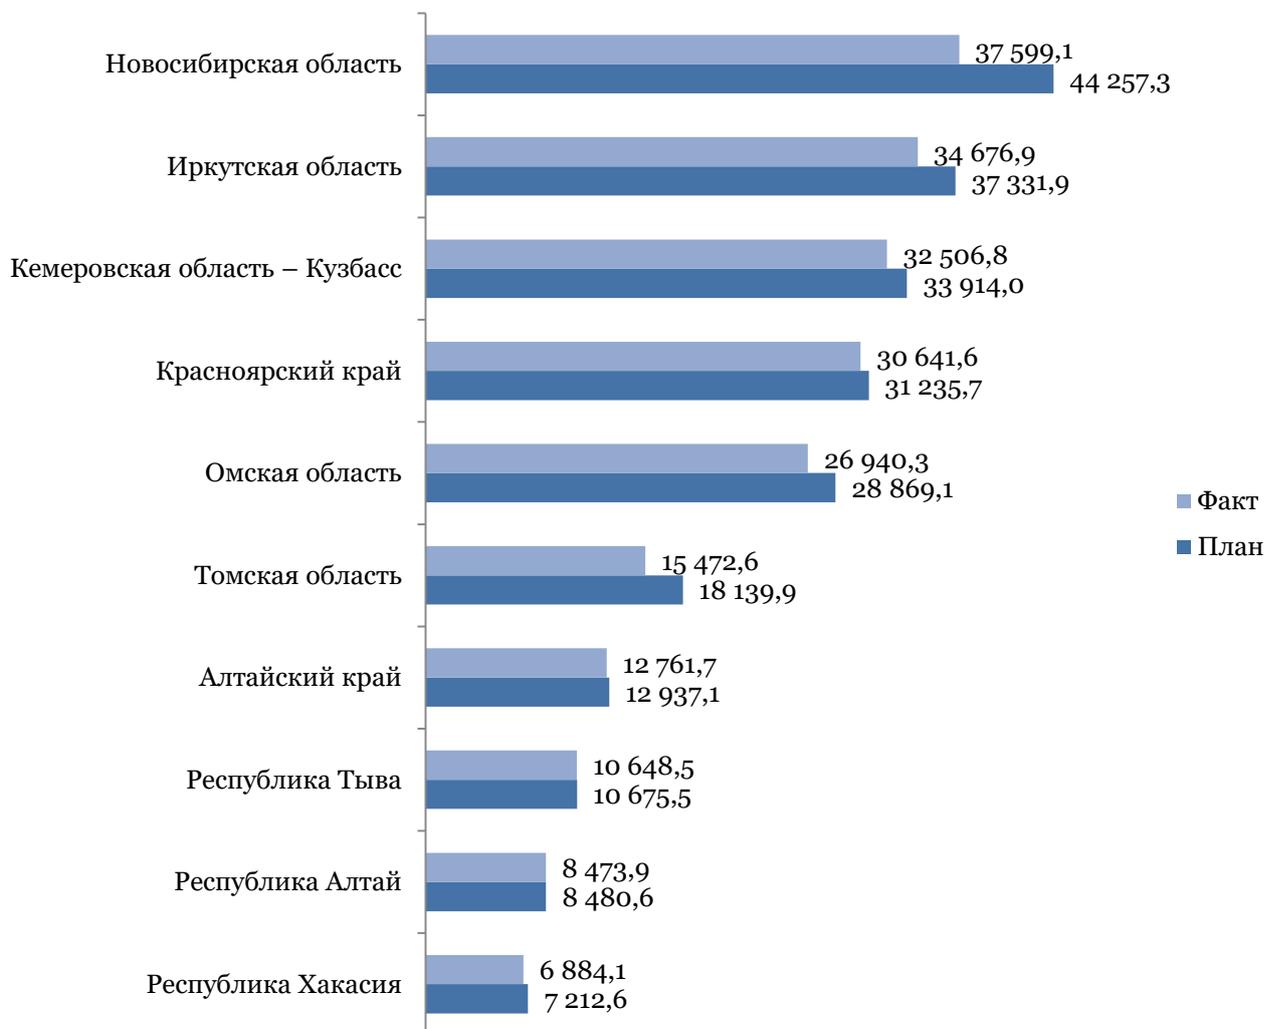

По степени исполнения НП (в процентном соотношении к плановым значениям) за 2023 год Иркутская область находится на 8 месте из 10 субъектов СФО (92,9%). По объему исполнения Иркутская область занимает 2 место из 10 субъектов СФО (34 676,9 млн. р.).

Иркутская область участвует в реализации 12 национальных проектов и Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В соответствии с информацией, размещенной в ГИС «Электронный бюджет», на 01.01.2024 в Иркутской области разработаны 55 паспортов РП в рамках 12 НП (таблица).

№	Код	Наименование НП	№	Код	Наименование РП
1	А	«Культура»	1	A1	«Культурная среда»
			2	A2	«Творческие люди»
			3	A3	«Цифровая культура»
2	D	«Цифровая экономика РФ»	4	D2	«Информационная инфраструктура»
			5	D3	«Кадры для цифровой экономики»
			6	D4	«Информационная безопасность»
			7	D5	«Цифровые технологии»
			8	D6	«Цифровое государственное управление»
3	E	«Образование»	9	E1	«Современная школа»
			10	E2	«Успех каждого ребенка»
			11	E3	«Поддержка семей, имеющих детей»
			12	E4	«Цифровая образовательная среда»
			13	E5	«Учитель будущего»
			14	E6	«Молодые профессионалы»
			15	E8	«Социальная активность»
			16	EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
4	F	«Жилье и городская среда»	17	EG	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»
			18	F1	«Жилье»
			19	F2	«Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»
			20	F3	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
5	G	«Экология»	21	F5	«Чистая вода»
			22	G2	«Комплексная система обращения с ТКО»
			23	G4	«Чистый воздух»
			24	G5	«Чистая вода»
			25	G7	«Сохранение озера Байкал»
6	I	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	26	GA	«Сохранение лесов»
			27	I2	«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
			28	I4	«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
			29	I5	«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
			30	I7	«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
			31	I8	«Популяризация предпринимательства»
7	J	«Туризм и индустрия гостеприимства»	32	J1	«Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область)»
			33	J2	«Повышение доступности туристических продуктов (Иркутская область)»
8	L	«Производительность труда и поддержка занятости»	34	L1	«Системные меры по повышению производительности труда»
			35	L2	«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
			36	L3	«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
9	N	«Здравоохранение»	37	N1	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
			38	N2	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
			39	N3	«Борьба с онкологическими заболеваниями»
			40	N4	«Детское здравоохранение Иркутской области»
			41	N5	«Медицинские кадры Иркутской области»
			42	N7	«Цифровой контур здравоохранения»
			43	N8	«Экспорт медицинских услуг»
10	P	«Демография»	44	N9	«Модернизация первичного звена здравоохранения»
			45	P1	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
			46	P2	«Содействие занятости»
			47	P3	«Старшее поколение»
			48	P4	«Укрепление общественного здоровья»
11	R	«Безопасные и качественные	49	P5	«Спорт - норма жизни»
			50	R1	«Дорожная сеть»

№	Код	Наименование НП	№	Код	Наименование РП
		автомобильные дороги»	51	R2	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
			52	R3	«Безопасность дорожного движения»
12	Т	«Международная кооперация и экспорт»	53	T2	«Экспорт продукции АПК»
			54	T4	«Экспорт услуг»
			55	T6	«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

В 2020 году окончена реализация 6 РП: «Поддержка семей, имеющих детей» (Е3), «Учитель будущего» (Е5), «Популяризация предпринимательства» (I8), «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (L3), «Экспорт услуг» (Т4), «Чистая вода» (G5). В 2022 году закончена реализация РП «Молодые профессионалы» (Е6) и в соответствии с дополнительным соглашением РП «Кадры для цифровой экономики» (D3). Также 31.12.2023 планируется окончание реализации РП «Повышение доступности туристических продуктов (Иркутская область)» (J2).

Таким образом, в 2023 году в Иркутской области реализуется 47 РП, из которых по 41 РП предусмотрено финансовое обеспечение. Не обеспечено финансовой составляющей 5 РП:

- D2 «Информационная инфраструктура» (министерство цифрового развития и связи Иркутской области);

- D5 «Цифровые технологии» (министерство цифрового развития и связи Иркутской области);

- I7 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (министерство сельского хозяйства Иркутской области)

- L1 «Системные меры по повышению производительности труда» (министерство экономического развития и промышленности Иркутской области);

- N8 «Развитие экспорта медицинских услуг» (министерство здравоохранения Иркутской области).

**По РП G2 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» исключено финансирование в 4 квартале 2023 года, как отмечалось ранее, по состоянию на 01.10.2023 исполнение составляло 0%.**

Кроме этого, 31.12.2024 по паспорту предусмотрено окончание реализации РП I7 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (министерство сельского хозяйства Иркутской области), при этом фактически данный РП в настоящее время не реализуется и в актуальной версии Закона о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Закон от 20.12.2023 № 161-ОЗ) финансирование на данный РП не предусмотрено.

В связи с чем КСП рекомендует министерству сельского хозяйства Иркутской области инициировать закрытие (завершение) данного регпроекта в ГИС «Электронный бюджет».

По информации размещенной на сайте <https://национальныепроекты.рф> в рамках национальных проектов Иркутская область реализовала следующие объекты:

1) Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»:

Ледовый город «Счастье чистой воды». С 15 ноября 2023 г. проект «Ледовый город «Счастье чистой воды» в Иркутске реализован к новогодним праздникам - 2024. Это главное туристическое событийное мероприятие года. Для воплощения проекта использовано более тысячи кубометров льда. В историческом центре Иркутска ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки.

2) Национальный проект «Образование»:

- Детский технопарк «Кванториум Байкал», Иркутская область, улица Сергеева, 5/6, Иркутск.

- Детский технопарк «Кванториум РЖД» Иркутск, Остров Юность, 3, Иркутск.

- Детский технопарк «Кванториум Сибирь» в Усолье-Сибирском, ул. Карла Либкнехта, 58/1, Усолье-Сибирское.

- Кванториум на базе школы №1 в Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 15, Черемхово.

- Кванториум на базе школы №10 Ангарска, г. Ангарск, квартал 76, д. 10.

Детские технопарки «Кванториум» — это новый формат дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет, где школьников знакомят с перспективными инженерными специальностями, научно-техническими направлениями в области программирования и разработки программ. Здесь для ребят доступно до 14 направлений обучения (квантумов).

Современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование — это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки по всей стране. Например, «Промдизайнквантум» познакомит с особенностями разработок в области транспорта. На «Биоквантуме» дети узнают, как работает наш организм, как он взаимосвязан с окружающей живой и неживой природой, учатся анализировать эту информацию и проверять ее в лабораторных условиях.

- Центр цифрового образования детей «IT-куб» в Братске, просп. Ленина, д.48, Братск.

- Центр цифрового образования «IT-куб», город Иркутск, ул. бульвар Рябикова, 63.

В центрах цифрового развития «IT-куб» дети 7–18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения.

3) Нацпроект «Демография»:

Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» малая трасса, Альпийская.

4) Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»:

Головной региональный Центр «Мой Бизнес» Иркутской области.

Во всех регионах РФ создана доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В её состав входят центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и др. В центрах «Мой Бизнес» можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах государственной поддержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке. Важно, что в Центрах «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству. На сегодняшний день по всей стране открыто более 400 центров «Мой Бизнес».

5) Нацпроект «Жилье и городская среда»:

- Сквер ТВОРИМИР в г. Свирск, реализовано благоустройство сквера, расположенного на прилегающей территории Дома Культуры «Русь».

- Площадь перед зданием Дома Быта г. Шелехов, общественная территория площадь перед зданием Дома быта расположена в южной части города Шелехова, в районе новой жилой застройки и мест розничной торговли. Проект благоустройства общественной территории предусматривал создание в городе Шелехове места притяжения.

- Лисихинский парк, сквер 300-летия города Иркутска, Лисихинский парк — одна из немногочисленных зеленых территорий в Октябрьском округе Иркутска. Иркутяне за два часа высадили здесь четыре тысячи деревьев. Несколько лет назад в парке построили часовню, привели в порядок прилегающую территорию около часовни, установили детскую площадку.

- Спортивная площадка ИРГУПС, общественное пространство с баскетбольной и волейбольной площадками, тренажерами и гимнастической зоной.

- Территория пешеходного променада, на бульваре Гагарина излюбленное место для прогулки и отдыха горожан.

- Микрорайон Энергетик в г. Братск (проведено благоустройство территории между жилыми домами № 6 по ул. Иванова и № 5 по ул. Зверева).

- Парк «Таежные бульвары». Территория парка располагается в жилом микрорайоне Юбилейном г. Саянска. Это место располагается в пешей доступности до значимых городских объектов — городского спортивного стадиона и Дома спорта, картинной галереи, библиотек, музея, городского рынка и городской площади, а также соседствует с образовательными и культурными объектами.

После реализации проекта в парке возведены современные архитектурные объекты, игровые зоны для детей, спортивные площадки, выставочные стенды и многое другое.

б) Нацпроект «Безопасные качественные дороги»:

- Участок автодороги «Куда-Хомутово-Турская» (4,5 по 5,1 км).

- Реконструкция искусственного сооружения на участке автомобильной дороги Куда-Хомутово-Турская. Этот мост относится к региональным дорогам. Работать приходилось в стесненных условиях, при этом движение транспорта с июля 2020 года на переправах не перекрывалось, что позволило не допустить транспортных заторов и затруднений для жителей. Это направление дорожной сети очень загруженное, особенно в часы пик.

7) Нацпроект «Наука и университеты»:

Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Университет видит своей миссией интеграцию инженерных знаний, технологий и, самое важное, человеческого капитала по направлениям своей специализации.

8) Нацпроект «Культура»:

МБУК «Централизованная библиотечная система» библиотека-филиал №1, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д. 26; Центральная библиотека МБУК «Заларинская централизованная библиотечная система», Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 51; МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» Библиотека «Истоки», г. Саянск, микрорайон «Ленинградский», д. 2; МКУК «Бугульдейская сельская библиотека», Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Ленина, 9; МКУ «Библиотека г. Байкальска», Слюдянский район, г. Байкальск, мкр Гагарина, 146А; МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» ЦГБ, ул. Интернациональная, 32А; МКУК «Нижеилимская центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева», 8 квартал, д. 23.

Фотографии отдельных объектов приведены в приложении 2.

### **3. Анализ финансового обеспечения мероприятий на реализацию региональных проектов Иркутской области**

Законом Иркутской области от 12.12.2022 № 112-ОЗ (в ред. от 13.12.2023) «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию РП предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **42 388 205,8 тыс. р.**

Сводной бюджетной росписью областного бюджета (далее – СБР) на реализацию РП, направленных на достижение целей национальных проектов, на 01.01.2024 предусмотрено **37 331 939,8 тыс. р.**, что составляет **12,5%** от общего объема расходной части областного бюджета (298 545 110,4 тыс. р.) или **12,8%** от бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП (СБР - 292 767 894,9 тыс. р.).

Реализация РП предусмотрена в рамках 16 из 22 ГП, доля РП в ГП на 01.01.2024 составила 12,8%, что отражено в таблице.

тыс. р.				
№	Наименование	План ГП	План РП	% РП в ГП
1	ГП «Развитие образования»	83 449 165,0	4 198 510,5	5,0
2	ГП «Развитие здравоохранения»	40 804 378,1	3 003 372,6	7,4
3	ГП «Социальная поддержка населения»	51 034 736,2	2 898 960,9	5,7
4	ГП «Развитие физической культуры и спорта»	3 502 929,1	212 481,5	6,1
5	ГП «Развитие культуры»	5 397 697,5	299 710,1	5,6
6	ГП «Молодежная политика»	403 514,6	152 876,3	37,9
7	ГП «Труд и занятость»	2 285 873,1	107 287,5	4,7
8	ГП «Комплексное развитие сельских территорий»	2 706 931,9	0,0	0,0
9	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»	17 182 090,6	3 394 615,8	19,8
10	ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»	3 249 758,4	0,0	0,0
11	ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений»	21 659 786,1	11 761 248,6	54,3
12	ГП «Доступное жилье»	12 143 725,7	6 484 036,3	53,4
13	ГП «Охрана окружающей среды»	2 774 772,1	1 062 142,1	38,3
14	ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	2 912 822,4	717 627,3	24,6
15	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	5 093 733,2	236 610,8	4,6
16	ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»	57 930,1	0,0	0,0
17	ГП «Управление государственными финансами Иркутской области»	20 140 895,8	0,0	0,0
18	ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»	7 949 311,8	1 094 935,4	13,8
19	ГП «Формирование современной городской среды»	1 601 360,5	1 599 617,6	99,9
20	ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»	1 963 701,9	0,0	0,0
21	ГП «Развитие юстиции и правовой среды»	1 515 786,6	0,0	0,0
22	ГП «Развитие лесного хозяйства»	4 936 994,2	107 906,5	2,2
Всего		292 767 894,9	37 331 939,8	12,8

Согласно представленной выше таблице наибольшая доля РП предусмотрена в рамках ГП «Формирование современной городской среды» (99,9%), ГП «ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений»» (54,3%), ГП «ГП «Доступное жилье»» (53,4%).

Бюджетные ассигнования на реализацию РП не предусмотрены в рамках 6 ГП:

- «Комплексное развитие сельских территорий»;
- «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»;
- «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»;
- «Управление государственными финансами Иркутской области»;
- «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»;
- «Развитие юстиции и правовой среды».

По результатам анализа информации о финансовом обеспечении и исполнении РП по состоянию на 01.01.2024 по данным ГИС «Электронный бюджет» и данным, предоставленным министерством финансов Иркутской области (далее – минфин), отклонений не выявлено.

#### **4. Анализ исполнения расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов за отчетный период. Причины неисполнения мероприятий региональных проектов**

СБР на реализацию РП, направленных на достижение целей национальных проектов, на 01.01.2024 предусмотрено **37 331 939,8 тыс. р.**, исполнение на 01.01.2024 составило **34 676 864,9 тыс. р. или 92,9%**, не исполнено **2 655 074,9 тыс. р.** бюджетных ассигнований (см. табл.).


тыс. р.				
№	Наименование	План	Факт	% исп.
1	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»	294 845,5	294 824,3	100,0
2	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»	2 864,6	2 864,6	100,0
3	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»	2 000,0	2 000,0	100,0
4	Региональный проект «Информационная безопасность»	15 124,7	15 124,7	100,0
5	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	7 180,0	7 180,0	100,0
6	Региональный проект «Современная школа»	2 878 927,6	2 834 717,8	98,5
7	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	105 820,9	105 820,8	100,0
8	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	150 532,0	150 531,9	100,0
9	Региональный проект «Социальная активность»	13 497,2	13 497,2	100,0
10	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	228 592,4	228 364,6	99,9
11	Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Иркутская область)»	124 892,5	124 572,2	99,7
12	Региональный проект «Жилье (Иркутская область)»	803 845,3	780 501,1	97,1
13	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	1 599 617,6	1 570 683,1	98,2
14	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	5 680 191,0	4 383 464,6	77,2
15	Региональный проект «Чистая вода»	1 943 004,6	1 941 692,5	99,9
16	Региональный проект «Чистый воздух»	1 130 049,0	1 130 013,9	100,0
17	Региональный проект «Сохранение озера Байкал»	1 383 704,3	1 383 704,2	100,0
18	Региональный проект «Сохранение лесов»	107 906,5	107 906,5	100,0
19	Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	16 444,2	16 444,2	100,0
20	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	45 029,5	45 004,1	99,9
21	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	285 829,8	285 829,3	100,0
22	Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область)»	728 908,6	695 100,7	95,4
23	Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов»	38 591,4	38 259,1	99,1
24	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	47 097,0	47 097,0	100,0
25	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	278 061,3	278 061,3	100,0
26	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	268 703,2	268 702,4	100,0
27	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	83 443,7	83 443,7	100,0

№	Наименование	План	Факт	% исп.
28	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	38 996,3	38 888,4	99,7
29	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	28 883,5	28 883,4	100,0
30	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	111 625,5	108 019,5	96,8
31	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	2 192 861,8	2 095 358,7	95,6
32	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	2 724 546,1	2 724 544,3	100,0
33	Региональный проект «Содействие занятости»	956 411,8	549 264,6	57,4
34	Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	174 600,1	172 842,3	99,0
35	Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	612,0	612,0	100,0
36	Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»	212 481,5	212 477,8	100,0
37	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)»	11 317 033,2	10 767 123,5	95,1
38	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	444 215,4	399 607,6	90,0
39	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	717 627,3	596 496,3	83,1
40	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	146 892,0	146 891,8	100,0
41	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	449,0	449,0	100,0
<b>Всего</b>		<b>37 331 939,8</b>	<b>34 676 864,9</b>	<b>92,9</b>

Согласно информации, отраженной в таблице выше, за 2023 год достигнуто полное исполнение по 23 региональным проектам.

Процент исполнения ниже среднего значения (92,9%) отмечен по 4 региональным проектам: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (90,0%), «Безопасность дорожного движения» (83,1%), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (77,2%), наименьший процент исполнения по РП «Содействие занятости» 57,4%.

В разрезе источников финансирования исполнение РП отражено на рисунке ниже.

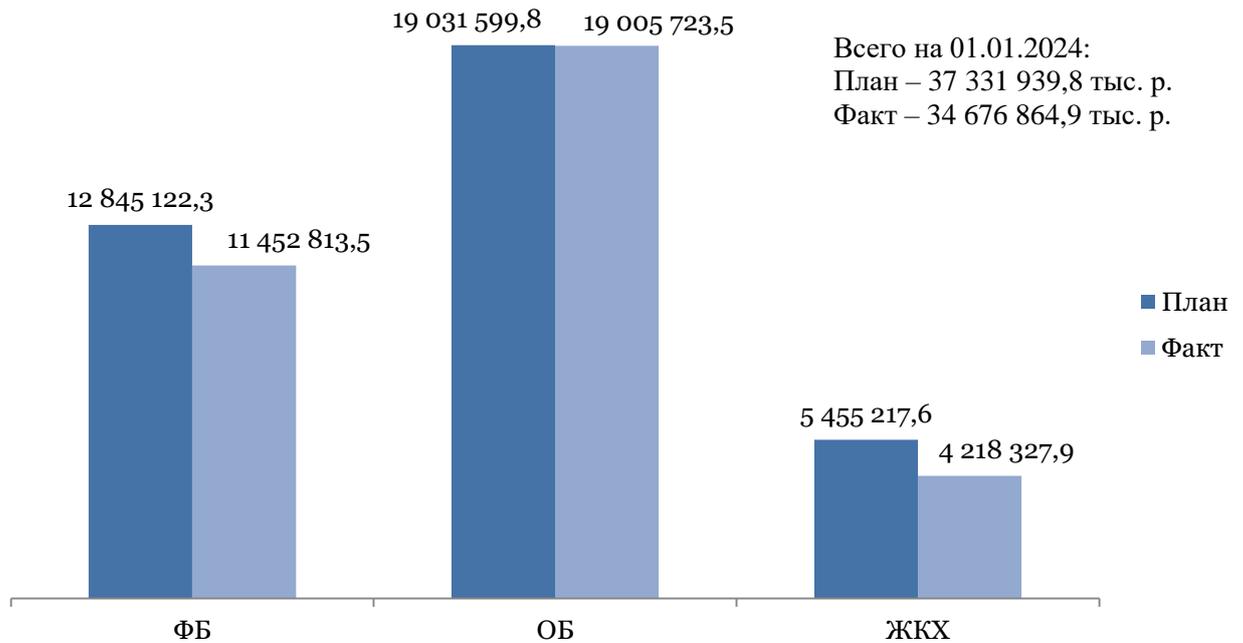

Так, средства федерального бюджета освоены на 89,2%, областного бюджета – 99,9%, фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – на 77,3%.

По итогам 2023 года исполнение сложилось на уровне 92,9%.

Анализ изменения бюджетных ассигнований на 2023 год показал, что к концу года бюджетные ассигнования сокращены на 8,4% в сравнении плановыми показателями по состоянию на 01.10.2023.

Наименование РП	тыс. р.			
	План 01.01.2024	План 01.10.2023	Разница	%
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»	294 845,5	294 845,5	0,0	0,0
РП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»	2 864,6	2 864,6	0,0	0,0
РП «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
РП «Информационная безопасность»	15 124,7	15 124,7	0,0	0,0
РП «Цифровое государственное управление»	7 180,0	7 180,0	0,0	0,0
РП «Современная школа»	2 878 927,6	3 718 850,8	-839 923,2	-22,6
РП «Успех каждого ребенка»	105 820,9	119 139,3	-13 318,4	-11,2
РП «Цифровая образовательная среда»	150 532,0	151 396,2	-864,3	-0,6
РП «Социальная активность»	13 497,2	13 307,1	190,1	1,4
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	228 592,4	244 980,9	-16 388,5	-6,7
РП «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Иркутская область)»	124 892,5	125 125,4	-232,9	-0,2
РП «Жилье (Иркутская область)»	803 845,3	918 940,2	-115 094,9	-12,5
РП «Формирование комфортной городской среды»	1 599 617,6	1 678 336,5	-78 718,9	-4,7
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	5 680 191,0	7 237 457,5	-1 557 266,4	-21,5
РП «Чистая вода»	1 943 004,6	1 925 479,5	17 525,1	0,9
РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	0,0	900 000,0	-900 000,0	-100,0
РП «Чистый воздух»	1 130 049,0	1 138 221,1	-8 172,1	-0,7
РП «Сохранение озера Байкал»	1 383 704,3	1 383 704,3	0,0	0,0
РП «Сохранение лесов»	107 906,5	107 906,5	0,0	0,0
РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	16 444,2	16 444,2	0,0	0,0
РП «Создание условий для легкого старта и	45 029,5	45 029,5	0,0	0,0

Наименование РП	План 01.01.2024	План 01.10.2023	Разница	%
комфортного ведения бизнеса»				
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	285 829,8	324 002,1	-38 172,3	-11,8
РП «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область)»	728 908,6	688 621,7	40 286,9	5,9
РП «Повышение доступности туристических продуктов»	38 591,4	38 591,4	0,0	0,0
РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	47 097,0	47 097,0	0,0	0,0
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	278 061,3	258 276,9	19 784,4	7,7
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	268 703,2	263 685,2	5 017,9	1,9
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	83 443,7	83 443,7	0,0	0,0
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	38 996,3	38 993,2	3,1	0,0
РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	28 883,5	26 552,8	2 330,7	8,8
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	111 625,5	111 625,5	0,0	0,0
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»	2 192 861,8	2 222 273,3	-29 411,5	-1,3
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	2 724 546,1	3 164 376,4	-439 830,3	-13,9
РП «Содействие занятости»	956 411,8	933 117,8	23 294,0	2,5
РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	174 600,1	164 078,1	10 522,0	6,4
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	612,0	612,0	0,0	0,0
РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»	212 481,5	212 481,5	0,0	0,0
РП «Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)»	11 317 033,2	10 826 070,9	490 962,3	4,5
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	444 215,4	444 215,4	0,0	0,0
РП «Безопасность дорожного движения»	717 627,3	728 634,1	-11 006,8	-1,5
РП «Экспорт продукции АПК»	146 892,0	147 071,3	-179,3	-0,1
РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	449,0	449,0	0,0	0,0
Всего:	37 331 939,8	40 770 603,0	-3 438 663,2	-8,4

По РП «Современная школа» плановый показатель уменьшен на 839 923,2 тыс. р. или 22,6%. Согласно соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, размещенным в Электронном бюджете, в течение года наблюдается следующие изменения.

К Соглашению № 073-09-2023-278 от 26.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 073-09-2023-278/2 от 05.04.2023 в котором средства субсидии на 2023 год увеличены на 462 495,0 тыс. р.

Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях по объекту Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест с 0 тыс. р. увеличены до 229 051,1 тыс. р., по объекту СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска без изменений 446 446,2 тыс. р.

Кроме того, добавлено финансирование на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по объекту Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест на сумму 163 443,9 тыс. р.

Дополнительным соглашением № 073-09-2023-278/6 от 08.12.2023 средства субсидии на 2023 год сокращены на 145 552,7 тыс. р.

Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях по объекту Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест и СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска без изменений.

Объемы финансирования на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по объекту Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест уменьшены с 163 443,9 тыс. р. до 17 891,2 тыс. р.

К концу года Дополнительным соглашением № 073-09-2023-278/7 от 15.12.2023 средства субсидии на 2023 год сокращены на 241 029,6 тыс. р.

Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях по объекту Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест с 229 051,1 тыс. р. уменьшены до 58 021,4 тыс. р. и по объекту СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска без изменений.

К Соглашению № 073-09-2023-417 от 26.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 073-09-2023-417/2 от 22.04.2023 в котором средства субсидии на 2023 год увеличены на 223 861,2 тыс. р. в связи с добавлением средств на «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» на следующие объекты:

- здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №75 – 73 230,5 тыс. р.;
- здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 – 150 630,7 тыс. р.

К концу года Дополнительным соглашением № 073-09-2023-417/6 от 08.12.2023 средства субсидии на 2023 год сокращены на 73 230,5 тыс. р. путем исключения объекта: здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №75.

К Соглашению № 073-17-2023-180 от 27.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 073-17-2023-180/2 от 09.11.2023 согласно которому средства субсидии на 2023 год сокращены на 88 205,0 тыс. р. путем сокращения финансового обеспечения на «Создание (восстановление) зданий общеобразовательных организаций, поврежденных или уничтоженных в результате наводнения на территории Иркутской области» по следующим объектам:

- школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области уменьшение с 149 459,7 тыс. р. до 79 019,7 тыс. р.,
- СОШ на 250 мест по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а уменьшение с 149 459,7 тыс. р. до 131 694,7 тыс. р.

По РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, размещенным в Электронном бюджете, в течение года наблюдается следующие изменения.

К соглашению № 082-09-2023-672 от 24.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 082-09-2023-672/2 от 23.11.2023, в котором средства субсидии на «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 2023 год увеличены на 54 336,0 тыс. р.

По РП «Жилье (Иркутская область)» согласно соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, размещенным в Электронном бюджете, в течение года наблюдается следующие изменения.

К соглашению № 069-09-2023-375 от 17.12.2022 в течение 2023 года заключено 7 дополнительных соглашений, информация представлена в таблице:

тыс. р.

Номер документа	Тип документа	Сумма на 2023 год	Дата заключения
069-09-2023-375	Соглашение	1 576 923,0	26.12.2022
069-09-2023-375/1	Дополнительное соглашение	1 576 923,0	16.02.2023
069-09-2023-375/2	Дополнительное соглашение	1 576 923,0	21.04.2023
069-09-2023-375/3	Дополнительное соглашение	817 199,3	30.05.2023
069-09-2023-375/4	Дополнительное соглашение	817 199,3	06.07.2023
069-09-2023-375/5	Дополнительное соглашение	729 790,5	08.12.2023
069-09-2023-375/6	Дополнительное соглашение	725 266,8	14.12.2023
069-09-2023-375/7	Дополнительное соглашение	724 210,6	15.12.2023

Финансовое обеспечение предусмотрено на «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Помимо изменения объемов финансирования дополнительными соглашениями вносились изменения в состав объектов капитального строительства. В первоначальном соглашении предусмотрено финансирование по 4 объектам, в дополнительном соглашении от 30.05.2023 количество объектов составляло 8, в последнем дополнительном соглашении от 15.12.2023 количество объектов составило 7.

В разрезе ГРБС исполнение РП на 01.01.2024 отражено в таблице.

тыс. р.

ГРБС	Код ГРБС	План	Факт	%
Министерство спорта Иркутской области	801	48 859,2	48 855,5	100,0
Министерство здравоохранения Иркутской области	803	1 614 390,9	1 609 875,1	99,7
Министерство культуры Иркутской области	804	181 083,4	181 083,4	100,0
Министерство труда и занятости Иркутской области	805	107 287,5	107 287,4	100,0
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	806	2 759 369,3	2 759 367,5	100,0
Министерство образования Иркутской области	807	741 209,6	740 785,8	99,9
Министерство сельского хозяйства Иркутской области	809	236 610,8	236 610,5	100,0
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	812	4 994 233,4	4 963 951,7	99,4
Министерство строительства Иркутской области	814	11 725 040,2	9 864 366,9	84,1
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	815	52 020,4	52 020,4	100,0
Министерство цифрового развития и связи Иркутской области	820	22 304,7	22 304,7	100,0
Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области	831	840 476,0	819 954,9	97,6
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	835	13 749 082,5	13 010 553,8	94,6
Министерство лесного комплекса Иркутской области	843	107 906,5	107 906,5	100,0
Министерство по молодежной политике Иркутской области	844	152 065,5	151 940,8	99,9
<b>Всего</b>		<b>37 331 939,8</b>	<b>34 676 864,9</b>	<b>92,9</b>

Наибольший объем средств на реализацию РП предусмотрен министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (13 749 082,5 тыс. р. или 36,8% от общего объема расходов, предусмотренных на РП), министерству строительства Иркутской области (11 725 040,2 тыс. р. или 31,4% от общего объема расходов, предусмотренных на РП). По 8 ГРБС на 01.01.2024 процент исполнения составил 100%, по министерству строительства Иркутской области исполнение составило 84,1%, ниже среднего значения (84,1%).

Утвержденные ассигнования областного бюджета в 2023 году направлены на реализацию РП по следующим видам расходов (таблица).

КВР	тыс. р.			
	План на 01.01.2024	Факт на 01.01.2024	% исп.	Доля КВР в общем объеме (план), %
100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	12 355,3	12 355,3	100,0	0,03
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	8 870 899,5	8 205 147,2	92,5	23,8
300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	2 959 578,7	2 959 257,6	100,0	7,9
400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	3 194 480,9	3 008 175,9	94,2	8,6
500 «Межбюджетные трансферты»	19 256 050,5	17 474 198,9	90,7	51,6
600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	1 934 268,0	1 933 468,9	100,0	5,2
800 «Иные бюджетные ассигнования»	1 104 306,9	1 084 261,2	98,2	3,0
<b>Всего</b>	<b>37 331 939,8</b>	<b>34 676 864,9</b>	<b>92,9</b>	

Согласно представленной выше таблице, наибольший объем расходов в сумме 21 647 111,9 тыс. р. или 51,6% от общего объема запланированных ассигнований на реализацию РП приходится на КВР 500 «Межбюджетные трансферты».

Согласно информации, представленной управлением проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на 31.12.2023 года образовались остатки средств, подлежащих контрактации:

1) министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области не освоены средства в размере **334,3 млн. р.** по НП «Безопасные качественные дороги»:

- РП «Безопасность дорожного движения» - 91,1 млн. р.,
- РП «Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)» - 208,5 млн. р.,
- РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - 34,7 млн. р.;

2) министерством строительства Иркутской области не освоены средства в размере **50,6 млн. р.**, из них:

- РП «Современная школа» - 42,5 млн. р.,
- РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» - 1,8 млн. р.,
- РП «Развитие туристической инфраструктуры» - 6,3 млн. р.;

3) министерством здравоохранения Иркутской области не освоены средства в размере 2,1 млн. р. по РП «Модернизация первичного звена».

В 2023 году фактическая контрактация в разрезе ГРБС Иркутской области по РП составила 97,2% от доведенных лимитов бюджетных обязательств (информация представлена в таблице).

ГРБС	тыс. р.			
	Лимиты 2023	В работе	Законтрактовано	Остаток
Министерство транспорта и дорожного хозяйства	9 337 726,2	2 835,0	9 000 572,7	334 318,5
Министерство строительства	2 069 801,8	0,0	2 019 213,7	50 588,1
Министерство здравоохранения	1 713 201,1	0,0	1 711 090,6	2 110,6
Министерство по молодежной политике	102 009,2	0,0	101 903,4	105,7
Министерство цифрового развития и связи	22 304,7		22 292,3	12,4
Министерство образования	332 477,2	0,0	332 323,9	153,3
Министерство спорта	33 623,0	0,0	33 619,7	3,3

Министерство сельского хозяйства	3 932,0	0,0	3 932,0	0,0
Министерство культуры	111 967,8		111 967,8	0,0
Министерство экономического развития и промышленности	449,0	0,0	449,0	0,0
Министерство жилищной политики и энергетики	180,0	0,0	180,0	0,0
Министерство лесного комплекса	77 248,0	0,0	77 248,0	0,0
Министерство социального развития, опеки и попечительства	15 751,5		15 766,6	-15,1
Итого	13 820 671,5	2 835,0	13 430 559,7	387 276,8

В 2023 году по информации министерства по регулированию контрактной системы Иркутской области министерством строительства в рамках РП реализуется строительство и ремонт следующих объектов:

тыс. р.

Наименование РП/мероприятия	Лимиты на 2023 год	Законтрактовано 2023	Остаток
<b>Региональный проект «Современная школа»</b>	<b>308 967,1</b>	<b>266 498,6</b>	<b>42 468,5</b>
Строительство объекта: "Средняя образовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а"	166 702,5	166 700,4	2,1
Строительство школы-детского сада на 128 мест д.Евдокимова Тулунского района Иркутской области	142 264,6	99 798,2	42 466,4
<b>Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»</b>	<b>1 389 088,4</b>	<b>1 389 041,7</b>	<b>46,7</b>
Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница»	200 000,0	200 000,0	0,0
Строительство и проектирование поликлиники на 200 посещений в п. Качуг Качугского района	180 446,1	180 446,1	0,0
Тангуйская участковая больница ОГБУЗ «Братская районная больница», по адресу: Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул. Набережная, 46	425 542,0	425 532,7	9,3
Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ №10» на бульваре Рябикова, 31 Свердловского района г. Иркутска с мощностью 500 посещений в смену	424 578,5	424 577,2	1,3
Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 150 посещений в смену по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булугатский район, п. Усть-Ордынский	110 185,0	110 185,0	0,0
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б	48 336,8	48 300,7	36,1
<b>Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область)»</b>	<b>232 154,7</b>	<b>225 836,7</b>	<b>6 318,0</b>
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской области	232 154,7	225 836,7	6 318,0
<b>Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»</b>	<b>139 591,6</b>	<b>137 836,7</b>	<b>1 754,9</b>

### 5. Анализ информации о реализации проектов, содержащей, в том числе, фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, сведений о возможных рисках недостижения показателей

В части исполнения региональных проектов на территории Иркутской области в 2023 году к реализации запланировано 146 показателей, по состоянию на 31.12.2023 года

достигнуто 143 показателя, что составляет 98%, не достигнуто 3 показателя по 2 региональным проектам.

1) РП «Содействие занятости» - не достигнут 1 показатель «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий» (план на 01.01.2024 – 4,395 тыс. мест, факт на 01.01.2024 – 4,275 тыс. мест). Не завершено строительство ОКТ «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской д.7».

2) РП «Безопасность дорожного движения» - не достигнуто 2 показателя:

- Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий (план на 01.01.2024 – 3,26 чел., факт на 01.01.2024 – 3,5969 чел.). С 01.01.2023 по 31.12.2023 зарегистрировано 247 ДТП со смертельным исходом, в которых погибло 300 чел. и 2906 чел. получили травмы различной степени тяжести. Показатель превышен на 10,3% в результате фактического количества погибших в ДТП по Иркутской области за 2023 год.

- Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий (план на 01.01.2024 – 11,65 чел., факт на 01.01.2024 – 12,7967 чел.). Показатель превышен на 9,9% в результате фактического количества погибших в ДТП по Иркутской области за 2023 год (300 чел.).

3) По РП «Развитие туристической инфраструктуры» - не достигнуто 3 результата:

- По соглашению № 069-2022-1007-1/6 от 20 июня 2023 года показатель результата «Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров» в количестве 2 объектов, срок достижения перенесен на 2024 год.

- По результату «Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)» не все объекты достроены и введены в эксплуатацию, планируемое количество реализуемых инвестиционных проектов составляет 10, на данный момент введены в эксплуатацию 8, по 2 объектам подан иск по неисполнению обязательств.

- Не выполнен показатель «Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения» за 2023 год, срок достижения перенесен на 2024 год, в связи с отказом участника (показатель уменьшен на 14 номеров).

4) Риски не достижения показателей и иные риски по состоянию на 01.01.2024 выявлены по РП «Современная школа» по значению результата «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором», так как строительство объекта «Здание начальной школы № 53» не завершено, в отчете срок выполнения указан 30.01.2024.

Результат «Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области» исключен на основании дополнительного соглашения от 27.11.2023 №073-17-2023-180/3.

По значению результата «Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников» - не закончено строительство «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского р-на Иркутской обл.», срок выполнения указан 31.01.2024.

5) По РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» присутствуют отклонения по следующим результатам:

- «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» процент готовности строительства Тангуйской участковой больницы ОГБУЗ «Братская районная больница» составляет 56% (срыв сроков реализации мероприятия со стороны Подрядчика). Заказчиком принимаются штрафные санкции в соответствии с условиями государственного контракта в отношении ООО «Фортуна». Информация направлена в Прокуратуру Иркутской области (№ 02-01-15079/23 от 18 декабря 2023 года). В адрес Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко за подписью Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева направлено письмо от 18 декабря 2023 года № 02-01-15079/23 с обоснованием задержки сроков выполнения работ по строительству Тангуйской участковой больницы и просьбой перенести срок завершения строительства на 2024 год, на которое 09.01.2024 года получен ответ о необоснованности переноса значения результата на 2024 год. По данным отчета прогнозный срок реализации 30.09.2024.

- «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» Шелеховская УБ ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», объект введен в эксплуатацию 27.12.2023, что затрудняет получение лицензии на медицинскую деятельность в 2023 году. Срок получения лицензии на медицинскую деятельность объекта до 1 февраля 2024 года.

- «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. чел.», по двум объектам (Тулунская ГБ и Усть-Кутская РБ) не завершены работы по вине Подрядчиков. Завершение работ планируется в срок до 15.02.2024 года.

- «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций», контракт на возведение одного ФАПа (ОГБУЗ «Киренская районная больница», с. Петропавловское) приостановлен подрядчиком до момента официального открытия ледовой переправы, ориентировочный срок получения лицензии на медицинскую деятельность по данному объекту – до 1 апреля 2024 года.

6) По РП «Содействие занятости» не критические отклонения по результату:

- «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях», не окончено строительство по 1 объекту.

7) По РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» не критические отклонения по результату:

- «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности», существует риск нарушения сроков регистрации объекта строительства в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, так как Администрацией Карлукского муниципального образования документы для регистрации объекта поданы не в полном объеме.

## **6. Оценка выявленных, вероятных и условных признаков нарушений по контрактам заключенным в рамках региональных проектов по данным модуля «Риск-Мониторинг» Единой информационной системы в сфере закупок**

По данным модуля «Риск-Мониторинг» Единой информационной системы в сфере закупок в Иркутской области по отдельным Национальным проектам отмечены признаки нарушений сроков исполнения контрактов, сроков оплаты контракта, сроков приемки со

стороны заказчика, информация представлена в таблице.

Наименование	Просрочка исполнения <b>этапа</b> контракта без применения мер ответственности	Просрочка исполнения контракта без применения мер ответственности	Нарушение сроков оплаты контракта (этапов контракта)	Нарушение сроков приемки ТРУ со стороны заказчика	Нарушение регламентных сроков размещения информации в реестре контрактов
Всего:	13	11	30	26	90
НП Жилье и городская среда	5	6	15	4	34
НП Здравоохранение			11	11	15
НП Безопасные качественные дороги	1	2	3	8	14
НП Культура	3	3		1	13
НП Образование	2			1	5
НП Экология					7
НП Демография	2		1	1	1
НП Туризм и индустрия гостеприимства					1

Наибольшее количество признаков нарушений выявлено по срокам оплаты контракта (этапов контракта) – 30 ед. и регламентных сроков размещения информации в реестре контрактов – 90 ед.

Так, по НП «Жилье и городская среда» количество вероятных признаков нарушений составило 64 ед., что на 36 больше чем по состоянию на 01.10.2023 (28 ед.).

Название показателя	Количество проявлений на 01.10.2023	Количество проявлений на 01.01.2024
<b>Вероятные признаки нарушений (признаки нарушений)</b>	<b>28</b>	<b>64</b>
Просрочка исполнения этапа контракта без применения мер ответственности	5	5
Просрочка исполнения контракта без применения мер ответственности	4	6
Нарушение сроков оплаты контракта (этапов контракта)	11	15
Нарушение сроков приемки ТРУ со стороны заказчика	1	4
Нарушение регламентных сроков размещения информации в реестре контрактов	7	34

По НП «Здравоохранение» отражено 37 вероятных признаков нарушений из них 15 - нарушение регламентных сроков размещения информации в реестре контрактов.

Название показателя	Количество проявлений на 01.10.2023	Количество проявлений на 01.01.2024
<b>Вероятные признаки нарушений (признаки нарушений)</b>	<b>14</b>	<b>37</b>
Просрочка исполнения контракта без применения мер ответственности	2	11
Нарушение сроков оплаты контракта (этапов контракта)	1	11
Нарушение регламентных сроков размещения информации в реестре контрактов	11	15

По следующим Национальным проектам отмечены условные признаки нарушений (риски) заключения контракта с единственным поставщиком (818 ед.).

Наименование	Заключение контракта с единственным поставщиком
НП «Жилье и городская среда»	467
НП «Здравоохранение»	172
НП «Безопасные качественные дороги»	64
НП «Образование»	38
НП «Экология»	26
НП «Демография»	25
НП «Культура»	16
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	10
Всего:	818

Также, в системе «Риск-Мониторинг» отражено 221 ед. вероятных признаков нарушений требований к размеру авансирования и обеспечению исполнения контракта и 401 ед. условных признаков нарушений (рисков) «контракт с авансом в случаях, предусмотренных законодательством».

Наименование	Нарушение требований к размеру авансирования	Контракт с авансом в случаях, предусмотренных законодательством
НП «Жилье и городская среда»	102	242
НП «Безопасные качественные дороги»	69	96
НП «Здравоохранение»	16	15
НП «Культура»	12	14
НП «Демография»	11	13
НП «Образование»	9	17
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	2	3
НП «Экология»		1
Всего	221	401

## **7. Нарушения, выявленные в ходе исполнения региональных проектов контролирующими органами в части бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок**

Службой государственного финансового контроля Иркутской области за 2023 год выявлены нарушения бюджетного законодательства при реализации следующих РП:

1) РП «Дорожная сеть» (R1).

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа принято решение о расходовании остатка средств субсидии (экономия в результате проведенных торгов по муниципальному контракту от 31.12.2019 № 1800019013) в сумме 4 839,4 тыс. р. не в соответствии с условиями предоставления субсидии в нарушение ст.139 БК РФ, постановлений Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп<sup>1</sup>, от 24.09.2018 № 675-пп<sup>2</sup>, от

<sup>1</sup> Постановление Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения».

<sup>2</sup> Постановление Правительства Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета».

23.12.2019 № 1118-пп<sup>3</sup>, соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 11.03.2020 № 25703000-1-2019-009.

Кроме этого, в рамках данного РП выявлены нарушения ведения бюджетного учета, выразившиеся в несвоевременном отражении фактов хозяйственной жизни в регистрах бюджетного учета (ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н).

2) РП «Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область)» (J1).

Агентством по туризму Иркутской области средства субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области использовались без соблюдения порядка и условий их предоставления, в том числе:

- в нарушение требований п. 1, 7, ст. 78 БК РФ, п. 14 Положения № 577-пп Агентством признан победителем отбора участник, имеющий в качестве материально-технической базы, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии, земельный участок с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», что не позволяет исполнить проект на реализацию мероприятий по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области до окончания 2022 года. Участнику в 2022 году без правовых оснований предоставлена субсидия в сумме 15 000,0 тыс. р.;

- в нарушение требований п. 9 ст. 78 БК РФ, под. 1 п. 2, под. 10 п. 14 Положения № 577-пп в отсутствие оснований грантополучателям продлен срок достижения результатов предоставления субсидии до 01.07.2023;

- в нарушение требований п. 1, 7, 9 БК РФ, п. 42 Положения № 577-пп соглашения с получателями субсидий заключены в 2022 году не в соответствии с формой, утвержденной приказом Минфина Иркутской области № 35н-мпр;

- в нарушение п. 4.3.3, 4.3.9, 6.1.1 Соглашения от 20.05.2022 № 174-09-2022-054 объектом контроля в 2022-2023 годах не размещались в подсистеме государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах бюджета Иркутской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и отчеты о достижении значений результатов использования субсидии;

- в нарушение пункта 4.3.3 Соглашения от 20.05.2022 № 174-09-2022-054 в 2022 году Агентством субсидии в общей сумме 203 617,5 тыс. р. предоставлены на реализацию 10 проектов, а не 14, что привело к необоснованному использованию бюджетных средств в объеме 35 284,1 тыс. р.

Установлены нарушения порядка организации и ведения бюджетного учета, повлиявшие на достоверность бюджетной отчетности и повлекшие ее искажение. Так, в нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 80 Инструкции № 162н, п. 18, 20 ФСБУ № 256н Агентством в 2022 году произведено необоснованное списание дебиторской задолженности грантополучателей на сумму 186 245,2 тыс. р. при отсутствии достижения

<sup>3</sup> Постановление Правительства Иркутской области от 23.12.2019 № 1118-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

результатов предоставления гранта. Данные действия привели к искажению бюджетной отчетности на 01.01.2023 формы 0503130 Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета. Объектом контроля показатель Баланса (ф. 0503130) занижен на 91,5%.

### 3) РП «Сохранение лесов» (GA).

В нарушение п. 4 Постановления № 538-пп Министерством лесного комплекса Иркутской области не соблюдены требования о размещении в единой информационной системе в сфере закупок проекта нормативного акта об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства для проведения обсуждения в целях общественного контроля.

Установлены нарушения ч. 1, 5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 119 531,8 тыс. р. Министерством не соблюдался порядок определения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок и при заключении государственного контракта.

- запросы в адрес поставщиков о предоставлении ценовой информации не направлялись;

- запросы о предоставлении ценовой информации в ЕИС не размещались; - сбор и анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемые в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами и т.п.) не осуществлялся.

### 4) РП «Дорожная сеть» (R1).

В нарушение ч. 12 ст. 22 Закона № 44-ФЗ ОГКУ «Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» при определении начальной (максимальной) цены контракта объектом контроля в сметную стоимость работ по ремонту участков автомобильных дорог включены затраты на строительство временных зданий и сооружений, расходы на содержание автомобильных дорог определены с отступлением от единичных расценок, утвержденных объектом контроля, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта по закупке на 10184,4 тыс. р. и занижению начальной (максимальной) цены контракта по закупке на 26 072,5 тыс. р.

В нарушение положений части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ объектом контроля путем заключения дополнительных соглашений внесены изменения в существенные условия государственных контрактов от 26.04.2022 № 02/120-22 и от 11.04.2022 № 02/106-22 (далее – контракты), а именно:

- изменены даты начала выполнения работ по содержанию на более ранний срок, что привело к перераспределению средств по контрактам в объеме 266 320,0 тыс. р.;

- увеличены объемы отдельных видов работ, предусмотренные контрактами, более чем на десять процентов, превышение установленного Законом № 44-ФЗ предельного размера увеличения объема работ составило 159 916,8 тыс. р.

В части законодательства в сфере закупок за 2023 год службой государственного финансового контроля Иркутской области проверено 59 закупок на общую стоимость 1 642 785,7 тыс. р., в рамках которых выявлен ряд количественных нарушений, что отражено в приложении 1.

Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК) по результатам проверок проведенных за 2023 год установлены следующие нарушения по РП:

1. Министерством спорта Иркутской области не обеспечено достижение значения результатов использования субсидии - «построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности»:

- не введен в эксплуатацию объект «Строительство спортивного оздоровительного комплекса в п. Плишкино Иркутского района Иркутской области» (вместо 25.12.2021 введен в эксплуатацию 14.11.2022);

- не введен в эксплуатацию «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный в микрорайоне Университетский в Свердловском районе г. Иркутска» (вместо 25.12.2022 введен в эксплуатацию 30.12.2022);

- не построен (техническая готовность 74%) и не введен в эксплуатацию объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А».

2. Министерством спорта Иркутской области не обеспечено исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и достижение результатов использования субсидии, а именно, уровень технической готовности по объекту капитального строительства «Строительство СОК в п. Плишкино Иркутского района» на 01.01.2022 составил 99,9% вместо 100%;

3. Министерством спорта Иркутской области не обеспечено исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и достижение результатов использования субсидии «уровень технической готовности на 01.01.2023» в части следующих объектов капитального строительства:

- строительство ФОК по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Весенняя, 8», процент исполнения составил 77,65%, фактическое значение составило 66,00% при установленном плановом значении - 85,00%. **Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет, составил за 2022 год – 6 274,9 тыс. р.;**

- ФОК по адресу: д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А», процент исполнения составил 74,00%, фактическое значение - 74% при установленном плановом значении - 100,00%. **Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет, составил за 2022 год - 6 234,5 тыс. р.**

4. Министерством строительства Иркутской области в нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ, пп. 3 п. 15.5 постановления Правительства Иркутской области от 20.05.2016 № 296-пп не обеспечено достижение значения результата регпроекта «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта» в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» (план «1», факт «0»):

- в 2021 году при строительстве Спортивного оздоровительного комплекса в п. Плишкино Иркутского района Иркутской области;

- в 2022 году при строительстве Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 "А".

5. МКУ «УКС г. Иркутска» **приняты и оплачены невыполненные работы** по акту приемки выполненных работ (ф. КС-2) на общую сумму 108,9 тыс. р. (из них **ФБ – 36,6 тыс. р.**): не установлено ограждение ПД-1 без поручня для одного пандуса (12,9 тыс. р.), не установлен навес Н1 с монтажом для одного пандуса (96,0 тыс. р.). **Данное нарушение устранено в ходе проверки.**

В нарушение ч. 6 и 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), п. 7.7, 9.1

муниципального контракта МКУ «УКС г. Иркутска» не направлено подрядчику требование об уплате штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в размере 100,0 тыс. р., при этом обеспечение исполнения муниципального контракта закончило свое действие и перестало обеспечивать исполнение подрядчиком его обязательств по муниципальному контракту. Подрядчиком, в течение 5 рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, не представлено Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения муниципального контракта. Нарушение устранено.

В нарушение ч. 4, 6, 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 12.7 муниципального контракта МКУ «УКС г. Иркутска» при неисполнении претензии не обратилось с иском в Арбитражный суд Иркутской области по истечению срока рассмотрения по выставленной претензии от 30.12.2022 № 2448 на общую сумму 284,8 тыс. р.

В нарушение ч. 6, 7 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 9.4 муниципального контракта МКУ «УКС г. Иркутска» в 2022 году в связи с включением в расчет пени за просрочку конечного срока выполнения работ и неверным определением количества дней просрочки, излишне начислена сумма неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту в сумме 7,7 тыс. р.

В нарушение п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ, ч. 9.1 и 9.2 ст. 22 Закона № 44-ФЗ МКУ «УКС г. Иркутска» в 2019 году при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметным методом допущено несоответствие локального сметного расчета проектной документации по строительству объекта «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: микрорайон Университетский в Свердловском районе г. Иркутска» (в проектной документации указано покрытие и кровля здания - кровельные сэндвич-панели МП ТСП-К-250-1000-МВ, в локальном сметном расчете указаны «Трехслойные сэндвич-панели МП-ТСП-7-250-1000-н-МВ-ТУ», применяемые для стеновых покрытий). Вследствие чего, МКУ «УКС г. Иркутска» **приняты акты приемки выполненных работ (ф. КС-2), не соответствующие проектной документации и исполнительной документации.**

МКУ «УКС г. Иркутска» в нарушение ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение муниципального контракта с 03.10.2022 по 30.01.2023 осуществлялось без обеспечения банковской гарантией (гарантийных обязательств), в том числе: при исполнении обязательств на сумму 135 768,4 тыс. р. (из них ФБ - 44 667,8 тыс. р.); по акту о приемке законченного строительством объекта (КС-11) от 27.12.2022 б/н капитального строительства: «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: микрорайон Университетский в Свердловском районе г. Иркутска».

МКУ «УКС г. Иркутска» в нарушение ст. 70, 72 БК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 94, ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ в 2022 году приняты и оплачены по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) ворота подъемно-секционные Вр-1 с улучшенной противопожарной характеристикой на сумму 241,8 тыс. р. (из них ФБ – 59,2 тыс. р.) вместо предусмотренных ПСД ворот Вр-1 обычных не огнестойких, при этом дополнительное соглашение о внесении изменений на замену ворот Вр-1 не составлялось, и соответствующие изменения в реестр контрактов не вносились. Установка ворот с улучшенными характеристиками не привела к увеличению цены контракта и дополнительному расходованию бюджетных средств.

В нарушение ст. 70 БК РФ, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в 2022 году МКУ «УКС г. Иркутска» допущено 4 случая несвоевременного размещения информации о стоимости исполненных обязательств в реестре контрактов, в том числе: платежные поручения от 30.08.2022 № 39749, № 39751, № 39752 размещены 12.09.2022 с нарушением

установленного срока на 6 дней; платежное поручение от 31.08.2022 № 397450 размещено 12.09.2022 с нарушением установленного срока на 5 дней.

В нарушение ст. 70 БК РФ, п. 1 ст. 743 ГК РФ, ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ в 2019 году МКУ «УКС г. Иркутска» при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта в результате необоснованного включения в локальный сметный расчет № 02-01-18 «Охранная сигнализация» стоимости интраскопа Rariscan 627XR, не предусмотренного проектной документацией, **допущено завышение начальной (максимальной) цены муниципального контракта от 13.08.2019 №0834300045219000065 на сумму 9 518,2 тыс. р. (из них ФБ - 3 201,9 тыс. р.).**

6. Администрацией МО «Жигаловский район» в нарушение п. 1 ст. 72, ст. 162 БК РФ, п. 1 ст. 720, п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 4.3 муниципального контракта от 21.06.2022 № 05 приняты к оплате в 2022 году первичные учетные документы акты КС-2, **содержащие фактически не выполненные работы** по монтажу лестниц трибун и фактически не поставленное оборудование и материалы на **общую сумму 9 178,9 тыс. р. (из них ФБ - 8 719,9 тыс. р.).**

**Частично нарушения были устранены:** подрядчиком поставлено на объект отсутствующее оборудование (насосы ВКС 4/28Б) на сумму 162,8 тыс. р. (из них ФБ - 154,6 тыс. р.). В части приемки и оплаты фактически невыполненных работ и непоставленного оборудования, материалов Администрацией **проведено снятие ранее принятых работ и оборудования (сторнирование), оформлены и приняты минусовые акты КС-2 на общую сумму 9 016,1 тыс. р. (из них ФБ - 8 565,3 тыс. р.).** Сторнированные работы остаются фактически не выполненными.

7. Администрацией Карлукского МО в нарушение пп. 3 п. 1 ст. 162 БК РФ, пп. 3 п. 15.5 постановления Правительства Иркутской области от 20.05.2016 № 296-пп, п. 4.3.3 Соглашения от 11.02.2020 № 05-59-71/20-59 в 2022 году не обеспечено достижение значения результата регпроекта «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта» в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», (плановое - 1, факт 0). По данному факту **Прокуратурой Иркутского района возбуждено дело об административном правонарушении** по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ, направленное на рассмотрение в УФК по Иркутской области.

В нарушение п. 1 ст. 72, ст. 162 БК РФ, п. 1 ст. 720, п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 4.1. муниципального контракта Администрацией в 2022 году приняты к оплате первичные учетные документы акты КС-2, **содержащие фактически не выполненные работы** по монтажу пожарных лестниц, прокладке трубопроводов, установке блоков из ПВХ в дверных проемах, устройству покрытий из плит и фактически не поставленное спортивное оборудование, лифтовое оборудование **на общую сумму 7 436,8 тыс. р. (из них ФБ - 6 916,2 тыс. р.),** что свидетельствует о наличии признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

В период проведения УФК проверки подрядной организацией выполнены работы по монтажу пожарных лестниц, по установке блоков из ПВХ в дверных проемах, устройству покрытий из плит керамогранитных и гладкой плитки, стоимостью 1 515,8 тыс. р. (из них ФБ - 1 459,7 тыс. р.).

8. В рамках проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий,

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, министерству образования Иркутской области направлено представление с требованием о принятии мер по устранению причин и условий нарушений, направлено письмо в УФАС Иркутской области о факте нарушения сроков оплаты. (Нарушения в сфере закупок - 168 619,4 тыс. р.)

9. В рамках проверки предоставления и использования субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в субъектах Российской Федерации, фонду микрокредитования Иркутской области направлено представление с требованием о принятии мер по устранению причин и условий нарушений, направлено письмо о принятии мер по усилению контроля за содержанием документов при подписании соглашений о предоставлении субсидий. (Прочие нарушения – 238 621,4 тыс. р.)

10. В рамках проверки соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в министерстве лесного комплекса Иркутской области, выявлены нарушения в сфере закупок – 150 599,6 тыс. р.

11. В рамках выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд и нужд субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение из федерального бюджета министерству здравоохранения Иркутской области направлено представление с требованием об устранении нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий, представление исполнено. Письмо о выявленных фактах и недостатке. Выявлены нарушения в сфере закупок – 158 059,1 тыс. р.

Областному государственному казенному учреждению «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» направлено представление с требованием об устранении выявленных нарушений и принятии мер по устранению их причин и условий (представление исполнено), письмо о выявленном недостатке. Выявлены нарушения в сфере закупок – 1 567,9 тыс. р.

12. В рамках выездной проверки соблюдения целей порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджету Иркутской области субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений областному государственному автономному учреждению «Лесхоз Иркутской области» направлено представление с требованием принять меры по устранению причин и условий нарушений. Представление исполнено. Письмо о выявленном недостатке. Письмо исполнено. Выявлены нарушения в использовании бюджетных средств - 2 497,5 тыс. р.

### **Основные выводы**

1. В Иркутской области утверждены паспорта 55 регпроектов в рамках 12 национальных проектов, в анализируемом периоде финансовое обеспечение предусмотрено по 41 регпроектам.

2. По РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (I7) по паспорту 31.12.2024, при этом, фактически, данный РП в настоящее время не реализуется. В связи с чем, министерству сельского хозяйства Иркутской области рекомендуется инициировать закрытие данного регпроекта в ГИС «Электронный бюджет».

3. Бюджетные ассигнования на реализацию РП в 2023 году предусмотрены в сумме 37 331 939,8 тыс. р., исполнение на 01.01.2024 составило 34 676 864,9 тыс. р. или 92,9%, не исполнено 2 655 074,9 тыс. р.

4. В 2023 году достигнуто полное исполнение по 23 региональным проектам.

Процент исполнения ниже среднего значения (92,9%) отмечен по 4 региональным проектам: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (90,0%), «Безопасность дорожного движения» (83,1%), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (77,2%), наименьший процент исполнения по РП «Содействие занятости» 57,4%.

5. Наибольший объем расходов в сумме 21 647 111,9 тыс. р. или 51,6% от общего объема запланированных ассигнований на реализацию РП приходится на КВР 500 «Межбюджетные трансферты». Исполнение межбюджетных трансфертов на 01.01.2024 составило 17 474 198,9 тыс. р. (90,7%).

6. За 2023 год остатки средств, подлежащих контрактации сложились по следующим министерствам:

- министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области не освоены средства в размере 334,3 млн. р. по НП «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения» - 91,1 млн. р., региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)» - 208,5 млн. р., региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - 34,7 млн.р.);

- министерством строительства Иркутской области не освоены средства в размере 50,6 млн. р., из них 42,5 млн. р. по региональному проекту «Современная школа», 1,8 млн.р. – региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», 6,3 млн. р. – региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»;

- министерством здравоохранения Иркутской области не освоены средства в размере 2,1 млн. р. по региональному проекту «Модернизация первичного звена».

7. В части исполнения региональных проектов на территории Иркутской области, в 2023 году к реализации запланировано 146 показателей, по состоянию на 31 декабря 2023 года достигнуто 143 показателя, что составляет 98%, не достигнуто 3 показателя по 2 региональным проектам.

8. По отдельным Национальным проектам отмечены признаки нарушений сроков исполнения контрактов, сроков оплаты контракта, сроков приемки со стороны заказчика, нарушений требований к размеру авансирования и обеспечению исполнения контракта.

9. По информации контролирующих органов (служба государственного финансового контроля Иркутской области, УФК по Иркутской области) за 2023 год выявлены нарушения по следующим регпроектам:

- Дорожная сеть;
- Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область);
- Социальная активность;
- Региональная и местная дорожная сеть;
- Патриотическое воспитание граждан РФ;
- Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»);

- Модернизация первичного звена здравоохранения;
- Спорт - норма жизни (выявлены нарушения, в том числе влекущие возврат средств в Федеральный бюджет);
- Сохранение лесов.

**Предложения:**

1. Направить заключение в Законодательное Собрание Иркутской области.
2. Направить заключение в Правительство Иркутской области.

Аудитор



К.С. Корень



Объект Иркутской области	Наименование	Проверено		Нарушения										
ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	Модернизация первичного звена здравоохранения	1	393 171,0	1				1				1	1	1
Министерство спорта Иркутской области	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва	4	37 522,0	5				1						
Министерство лесного комплекса Иркутской области	Сохранение лесов	1	25 050,0				1							
Всего:		59	1 642 785,7	32	4	20	2	5	2	9	1	1	1	


НП	Объект
Туризм и индустрия гостеприимства	Ледовый город "Счастье чистой воды"
	
«Жилье и городская среда»	Сквер ТВОРИМИР в г. Свирск
	
«Жилье и городская среда»	Лисихинский парк, сквер 300-летия города Иркутска
	

«Жилье и городская среда»

Территория пешеходного променада



«Образование»

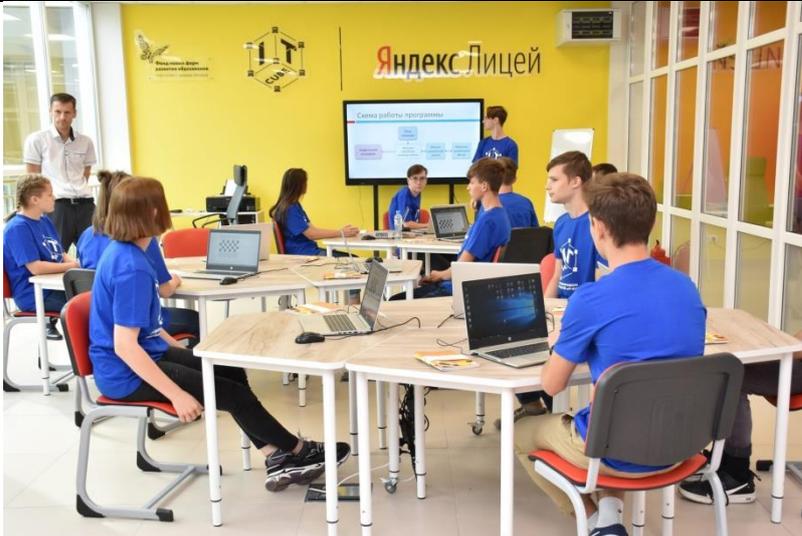Центр цифрового образования «IT-куб».  
Иркутск

«Демография»

Спортивная школа олимпийского резерва  
«Олимп», Малая трасса, Альпийская.
