



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение № 01/7-ЭАМ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области за январь-декабрь 2021 года»

30.03.2022

г. Иркутск

1. Основание: план деятельности КСП Иркутской области на 2022 год.

2. Предмет: отчетность об исполнении областного бюджета Иркутской области, данные государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – ГИИС, Электронный бюджет), иных ГИС, ЕИС, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иные данные.

3. Объекты мероприятия: министерство финансов Иркутской области (по запросу), министерство экономического развития Иркутской области (по запросу), иные ГРБС Иркутской области.

4. Цели мероприятия: оперативный анализ реализации региональных проектов Иркутской области.

5. Анализируемый период: январь-декабрь 2021 года.

6. Сроки проведения мероприятия: 3 квартал 2022 года.

Информация подготовлена на основании результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного бюджета и консолидированного бюджета Иркутской области по состоянию на 01.01.2022.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поручено обеспечить достижение национальных целей, в соответствии с которыми разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ национальные проекты (программы). Положение об организации проектной деятельности в Правительстве РФ утверждено постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288. Согласно п. 3 Положения, обеспечение достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнения задач НП осуществляется посредством исполнения федеральных проектов (далее - ФП).


Положение об организации проектной деятельности в Иркутской области утверждено постановлением Правительства Иркутской от 03.06.2019 № 440-пп (далее – Положение). В соответствии с пунктом 2 Положения РП - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов ФП, мероприятия, которого относятся к законодательно установленным полномочиям Иркутской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований.

Согласно пункту 4 Положения, утверждение паспорта РП является основанием для включения данного проекта в государственную программу Иркутской области далее - ГП).

В соответствии с пунктом 6 Положения, проект обособляется в виде отдельного структурного элемента ГП, соответствующего уровню основного мероприятия.

Согласно пункту 8 Положения, региональный проектный офис (далее - РПО) является структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющим функции по организации проектной деятельности в Иркутской области. В соответствии с пунктом 10, РПО осуществляет функции в отношении РП, в том числе – рассматривает и согласовывает паспорта РП, осуществляет мониторинг их реализации.

По объему средств бюджетов всех уровней, предусмотренных на 2021 год на реализацию НП, Иркутская область (32 937,0 млн. р.) занимает 2 место среди субъектов Сибирского федерального округа (далее – СФО) (194 878,3 млн. р.). Планируемый и исполненный объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию НП, по состоянию на 01.01.2022 по СФО отражен на рисунке.

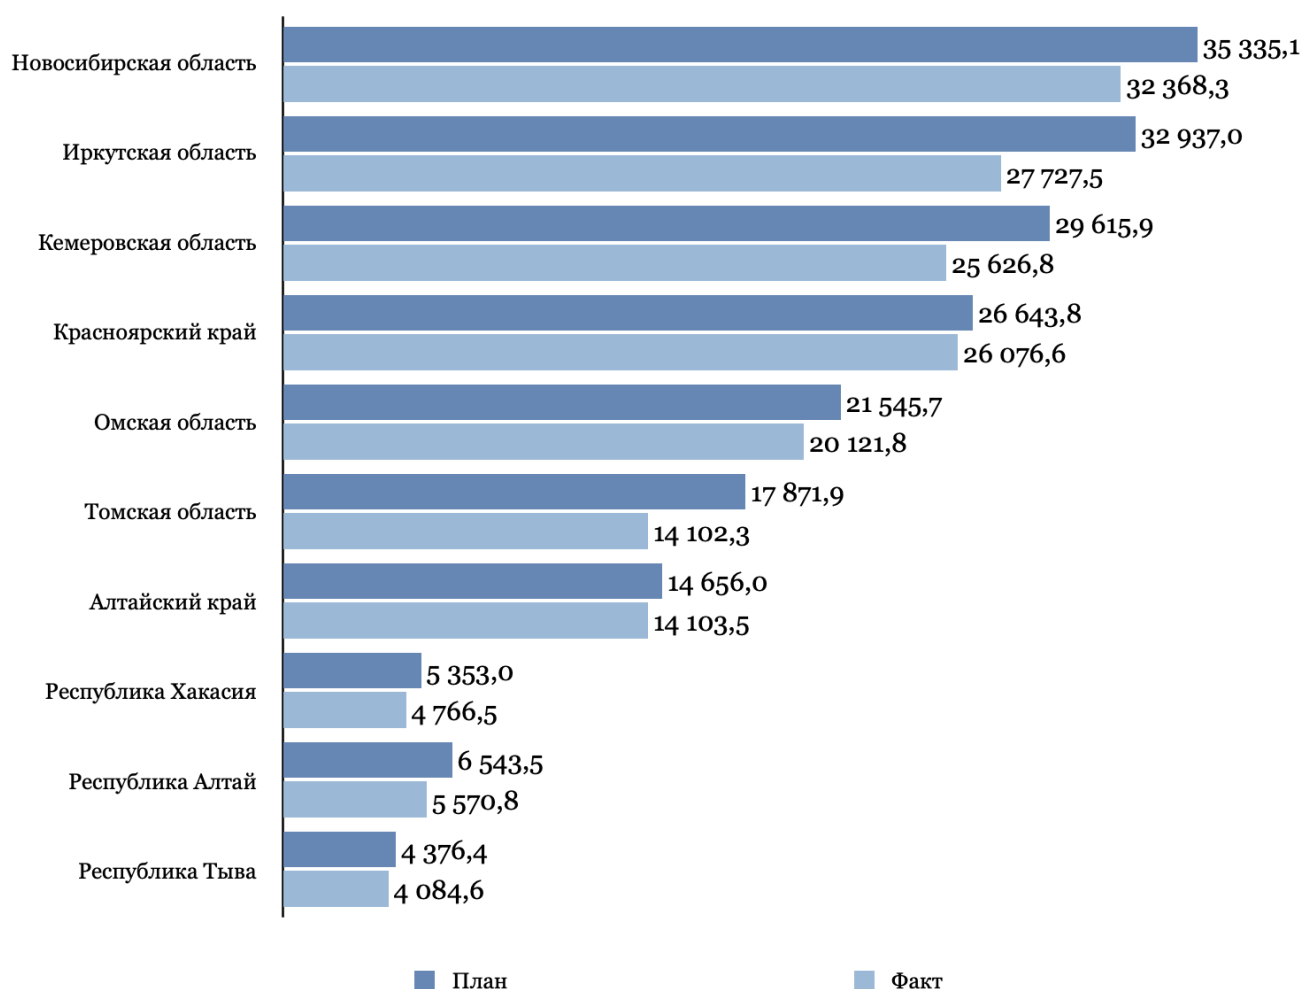

По проценту исполнения НП за 12 месяцев 2021 года Иркутская область находится на 9 месте из 10 субъектов СФО (84,2%). По объему исполнения Иркутская область занимает 2 место из 10 субъектов СФО (27 727,5 млн. р.).

В соответствии с информацией, размещенной в ЭБ, на 01.01.2022 в Иркутской области разработан 51 паспорт РП в рамках 11 НП (таблица).

№	Код	Наименование НП	№	Код	Наименование РП
1	А	«Культура»	1	A1	«Культурная среда»
			2	A2	«Творческие люди»

№	Код	Наименование НП	№	Код	Наименование РП
2	D	«Цифровая экономика РФ»	3	A3	«Цифровая культура»
			4	D2	«Информационная инфраструктура»
			5	D3	«Кадры для цифровой экономики»
			6	D4	«Информационная безопасность»
			7	D5	«Цифровые технологии»
			8	D6	«Цифровое государственное управление»
3	E	«Образование»	9	E1	«Современная школа»
			10	E2	«Успех каждого ребенка»
			11	E3	«Поддержка семей, имеющих детей»
			12	E4	«Цифровая образовательная среда»
			13	E5	«Учитель будущего»
			14	E6	«Молодые профессионалы»
			15	E8	«Социальная активность»
			16	EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
4	F	«Жилье и городская среда»	17	F1	«Жилье»
			18	F2	«Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»
			19	F3	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
			20	F5	«Чистая вода»
5	G	«Экология»	21	G2	«Комплексная система обращения с ТКО»
			22	G4	«Чистый воздух»
			23	G7	«Сохранение озера Байкал»
			24	GA	«Сохранение лесов»
6	I	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	25	I1	«Улучшение условий»
			26	I2	«Поддержка самозанятых»
			27	I4	«Преакселерация»
			28	I5	«Акселерация»
			29	I7	«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»
			30	I8	«Популяризация предпринимательства»
7	L	«Производительность труда и поддержка занятости»	31	L1	«Системные меры по повышению производительности труда»
			32	L2	«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
			33	L3	«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
8	N	«Здравоохранение»	34	N1	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
			35	N2	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
			36	N3	«Борьба с онкологическими заболеваниями»
			37	N4	«Детское здравоохранение Иркутской области»
			38	N5	«Медицинские кадры Иркутской области»
			39	N7	«Цифровой контур здравоохранения»
			40	N8	«Экспорт медицинских услуг»
9	P	«Демография»	41	P1	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
			42	P2	«Содействие занятости»
			43	P3	«Старшее поколение»
			44	P4	«Укрепление общественного здоровья»
			45	P5	«Спорт - норма жизни»
10	R	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	46	R1	«Дорожная сеть»
			47	R2	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
			48	R3	«Безопасность дорожного движения»
11	T	«Международная кооперация и экспорт»	49	T2	«Экспорт продукции АПК»
			50	T4	«Экспорт услуг»
			51	T6	«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Согласно форме «Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Иркутской области на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов в 2021 году» на 01.01.2022 объем финансового обеспечения на 12 месяцев 2021 года предусмотрен по СБР –32 936 993,3 тыс. р. кассовое исполнение – 27 727 483,3 тыс. р., что не соответствует данным размещенным в ЭБ.

Не указан объем финансового обеспечения на 2021 год по паспорту РП «Жилье» на реализацию мероприятий. Также по РП «Социальная активность», «Современная школа», «Содействие занятости», «Дорожная сеть» и «Безопасность дорожного движения» в ЭБ отражаются некорректные данные в разделе 5 «Сведения об исполнении бюджета» Финансовое обеспечение, кассовое исполнение на 01.01.2022 данная информация требует уточнения (таблица).

Код	Наименование РП	Электронный бюджет				СБР	Факт на 01.01.2022	Разн. СБР	Разн. Факт
		по паспорту РП	СБР 2021 год	Учтенные БО	Факт на 01.01.2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-7	10=6-8
E1	Современная школа	955 379,6	955 379,6	629 447,9	675 476,2	1 027 150,6	675 476,2	-71 771,0	0,0
E8	Социальная активность	27 783,7	27 783,7	27 740,9	27 740,9	28 003,7	27 960,9	-220,0	-220,0
F1	Жилье	0,0	0,0	0,0	0,0	288 138,6	287 588,7	-288 138,6	-287 588,7
G2	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	0,0	0,0	0,0	0,0	18 388,9	18 382,5	-18 388,9	-18 382,5
J1	Развитие туристической инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	0,0	736 991,1	272 489,8	-736 991,1	-272 489,8
P2	Содействие занятости	1 198 037,5	2 553 207,2	1 071 537,3	1 057 681,0	2 574 291,5	1 078 748,9	-21 084,3	-21 067,9
R1	Дорожная сеть	9 217 403,8	9 711 202,9	16 514 983,1	9 232 206,4	9 801 202,9	9 322 206,4	-90 000,0	-90 000,1
R3	Безопасность дорожного движения	101 532,9	159 306,5	122 125,3	103 174,2	164 946,5	108 814,2	-5 640,0	-5 640,0

На 01.01.2022 фактическая контрактация по региональным проектам составила 96,7% от плановых показателей (таблица).

Наименование ГРБС	тыс. р.			
	План на 01.01.2022 (ФБ+ОБ+МБ)	Факт на 01.01.2022	% от плана	Экономия в результате торгов, тыс. р.
Министерство по молодежной политике	31 326,7	31 240,0	99,7	86,7
Министерство лесного комплекса	296 495,0	296 495,0	100,0	0,0
Министерство труда и занятости	46 313,0	46 229,0	99,8	0,0
Министерство сельского хозяйства	2 438,0	2 438,0	100,0	0,0
Министерство культуры и архивов	0,0	0,0	0,0	0,0
Министерство социального развития, опеки и попечительства	0,0	0,0	0,0	0,0
Министерство природных ресурсов и экологии	339 179,0	339 179,0	100,0	0,0
Министерство спорта	11 461,1	11 458,8	100,0	2,3
Министерство экономического развития	580,0	580,0	100,0	0,0
Министерство здравоохранения	1 081 909,6	1 070 849,0	99,0	11 060,6

Наименование ГРБС	План на 01.01.2022 (ФБ+ОБ+МБ)	Факт на 01.01.2022	% от плана	Экономия в результате торгов, тыс. р.
Министерство транспорта	7 381 916,8	7 065 210,7	95,7	316 706,1
Министерство образования	602 877,0	602 044,0	99,9	833,0
Министерство жилищной политики и энергетики	3 100,2	3 100,2	100,0	0,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0
Министерство имущественных отношений	0,0	0,0	0,0	0,0
Министерство цифрового развития и связи	32 033,9	32 033,9	100,0	0,0

Общее количество замечаний к формированию параметров РП осуществляемых в 2021 году на территории Иркутской области составляет 759 ед. в том числе со статусом: «ошибки» - 2 ед.; «предупреждения» - 757 ед.

Предупреждения подразделяются на:

- (КТ12) КТ не содержит характеристику – 342 ед.
- (КТ3) КТ не содержит уровень контроля - 252 ед.
- (КТ11) ОКТ с признаком не требуется - 97 ед.
- (КТ1) КТ не содержит ответственного - 24 ед.
- (Ф10) Объемы ФО Бюджета субъекта по результату не соответствует значению, установленному в Бюджете - 21 ед.
- (Р18) У значения результата имеются нулевые значения - 10 ед.
- (Р13) Значение результата паспорта РП не равно значению результата из распределения по региональному проекту - 3 ед.
- (Ц12) Наименование основного показателя в паспорте РП не равно наименованию основного показателя паспорта ФП из распределения по региональному проекту - 2 ед.
- (О3) Не указан Администратор проекта - 2 ед.
- (О4) Не указан РОИВ - 1 ед.
- (Р17) Базовое значение (не) должно быть больше значения результата - 1 ед.
- (О12) Общий процент участия по всем проектам превышает 100% - 1 ед.
- (Ц14) Значение основного показателя паспорта РП по годам не равно значению основного показателя паспорта ФП из распределения по региональному проекту - 1 ед.

Данные ошибки и предупреждения отмечены по следующим РП:

Наименование РП	Предупреждения	Ошибки
(A1) Культурная среда	1	-
(D2) Информационная инфраструктура	4	-
(D4) Информационная безопасность	2	-
(E8) Социальная активность	16	-
(F1) Жилье	159	-
(F2) Формирование комфортной городской среды	119	-
(G2) Система обращения с ТКО	3	-
(G4) Чистый воздух	16	-
(G7) Сохранение озера Байкал	30	-
(GA) Сохранение лесов	7	-
(I2) Поддержка самозанятых	16	-
(I4) Предакселерация	78	-
(L2) Адресная поддержка	12	-
(N1) Первичная медико-санитарная помощь	1	-
(N2) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	-
(N3) Борьба с онкологическими заболеваниями	2	-
(N4) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	3	-

Наименование РП	Предупреждения	Ошибки
(N5) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	7	-
(P1) Финансовая поддержка семей при рождении детей	111	-
(P3) Старшее поколение	3	-
(P4) Укрепление общественного здоровья	2	-
(P5) Спорт-норма жизни	19	-
(R1) Дорожная сеть	40	-
(R2) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	2	-
(R3) Безопасность дорожного движения	12	2
(T2) Экспорт продукции АПК	18	-
(T5) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту	73	-

Таким образом, требуется корректировка данных РП в системе ЭБ.

Согласно данным ЭБ по РП предусмотрено:

- 138 показателей, из них на 01.01.2022 без отклонений – 106 ед. с некритическими отклонениями – 32 ед.;

- 244 значения результата, из них на 01.01.2022 без отклонений – 225 ед. с некритическими отклонениями – 19 ед.;

В разрезе РП показатели и значения результатов представлены в Приложении 1.

Наибольшее количество показателей РП предусмотрено по РП Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям – 13 ед. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях – 12 ед. Первичная медико-санитарная помощь – 10 ед. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – 10 ед.

Наибольшее количество результатов РП предусмотрено по РП Современная школа – 20 ед. Успех каждого ребенка – 16 ед. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям – 14 ед.

За 12 месяцев 2021 года присутствуют риски в реализации 18 РП, связанные с некритическими отклонениями по показателям и результатам. Информация по данным отклонениям в разрезе РП представлена в Приложении 2.

По РП (G4) Чистый воздух значение показателя «Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год» Плановое значение: 1,36. Фактическое значение: 0,8. Существует риск: Не достижение значения показателя по г. Братску, Причина риска: Отсутствие финансирования из ФБ. Необходимость корректировки значений показателя. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Скорректировать значение показателя, срок исполнения 31.12.2021. Риск недостижения показателя (отсутствует необходимое количество ТС, работающих на газе).

По РП «(I2) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на 01.01.2022 присутствует наличие некритических отклонений по значению результата: Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (указать количество объектов). План: 18. Факт: 1. Существует риск: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, не менее чем на 10% ежегодно нарастающим итогом. Причина риска: Муниципальные образования Иркутской области оказывают имущественную поддержку самозанятым. В связи с тем, что заявок от

самозанятых граждан не поступает, показатель по состоянию на 31.12.2021 год не исполнен в полном объеме. Вероятность: 90%, Суточные: значение показателя не выполнено в 2021 году в связи с тем, что самозанятые граждане не обращались за имущественной поддержкой. Принятые меры: 1. Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области направлены письма в муниципальные образования Иркутской области о необходимости оказания имущественной поддержки для самозанятых граждан до конца 2021 года, срок исполнения 31.12.2021, значение показателя не выполнено в 2021 году в связи с тем, что самозанятые граждане не обращались за имущественной поддержкой. Просрочка 1 день.

По РП (N2) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеются отклонения по показателям.

По показателю «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.» план 4,775. Факт: 2,449. Существует риск: Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. Причина риска: В связи с неблагоприятной эпидобстановкой по новой коронавирусной инфекции оказание плановой медицинской помощи было приостановлено, Вероятность: 100%, Суточные: показатель не достигнут. Принятые меры: 1. При улучшении эпидобстановки по новой коронавирусной инфекции показатель будет достигнут, срок исполнения 01.04.2022, при улучшении эпидобстановки показатель будет достигнут. Приостановление плановой медицинской помощи, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией covid-19 повлияло на достижение данного показателя.

По показателю «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)» План: 1,75. Факт: 2,9. Существует риск: Не достижение показателя, Причина риска: Не достижение показателя «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением» в 2021 году обусловлено тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вероятность: 100%, Суточные: Показатель не достигнут, рост смертности от БССС. Принятые меры: 1. При нормализации эпидситуации по новой коронавирусной инфекции возможно достижение данного показателя, срок исполнения 01.04.2022. Недостижение показателя «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением» в 2021 году обусловлено тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По РП (N3) Борьба с онкологическими заболеваниями по показателю: "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)" План: 23,1. Факт: 26,8. Существует риск: Одногодичная летальность, Причина риска: Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией covid-19 усугубляет течение онкологических заболеваний, Вероятность: 100%, Суточные: показатель не достигнут. Принятые меры: 1. приобретена компьютерная программа «Онкор», планируется поэтапное внедрение, срок исполнения 01.04.2022. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией covid-19 усугубляет течение онкологических заболеваний.

По показателю: "Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением". План: 66. Факт: 48,9. Существует риск: доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и / или лечение в текущем году из числа


состоящих по диспансерным наблюдением, %, Причина риска: Рост числа заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, Вероятность: 100%, Суточные: Показатель не достигнут. Принятые меры: 1. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и / или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением увеличится при улучшении эпидобстановки по новой коронавирусной инфекции, срок исполнения 01.06.2022. Ввиду роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией данный показатель в 2021 году не достигнут.

По информации министерства финансов Иркутской области об исполнении РП по состоянию на 01.01.2022 запланированный объем бюджетных средств составил 32 936 993,3 тыс. р. или 13,3% от общего объема расходов областного бюджета (246 805 076,8 тыс. р.). Исполнение расходов по РП на 01.01.2022 составило 27 727 483,2 тыс. р., или 84,2% (таблица).

тыс. р.

Наименование	Всего	в том числе		
		средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства Фонда ЖКХ
Расходы на 2021 год по СБР	32 936 993,3	17 300 214,5	12 452 767,2	3 184 011,6
Факт	27 727 483,2	16 234 577,5	10 183 060,8	1 309 845,1
% исполнения	84,2	93,8	81,8	41,1
Неисполненные назначения	5 209 510,1	1 065 637,0	2 269 706,4	1 874 166,5

Плановые источники финансирования мероприятий РП (32 936 993,3 тыс. р.) и их фактическое исполнение (27 727 483,2 тыс. р.) по состоянию на 01.01.2022 представлены на рисунке.

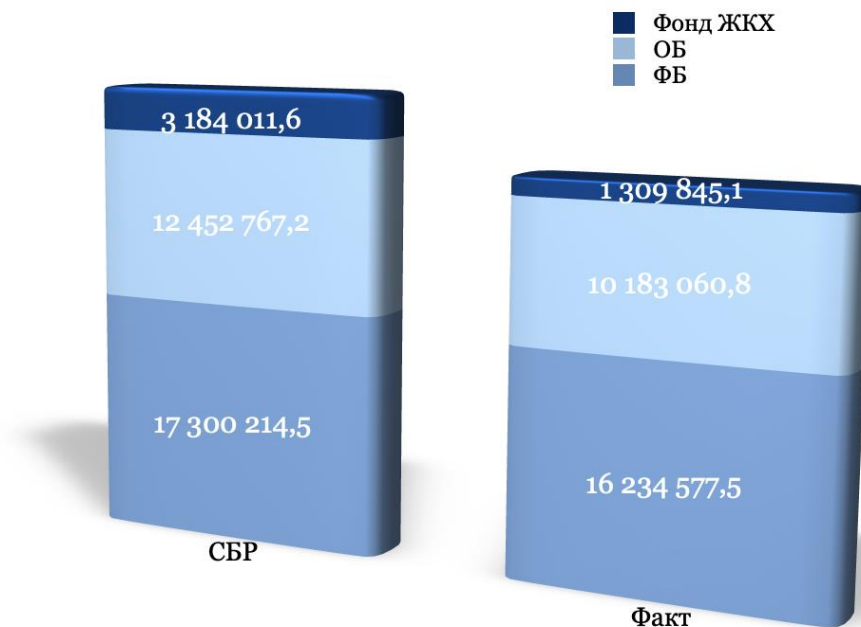

Фактическое исполнение РП за период январь-декабрь 2021 года составило 27 727 483,2 тыс. р. или 84,2 %, что представлено в разрезе РП в таблице.

тыс. р.

Наименование РП	План по СБР	Факт на 01.01.2022	%	Остаток на 01.01.2022	Факт 01.01.2021	%
Культурная среда	172 836,1	172 836,0	100,0	-0,1	223 458,6	-22,7
Творческие люди	2 500,0	2 500,0	100,0	0,0	-	0,0
Цифровая культура	9 000,0	9 000,0	100,0	0,0	3 000,0	200,0
Информационная инфраструктура	32 034,3	32 034,2	100,0	0,0	-	0,0
Информационная безопасность	6 840,0	6 840,0	100,0	0,0	-	0,0
Цифровое государственное управление	8 370,0	8 370,0	100,0	0,0	10 980,0	-23,8
Современная школа	1 027 150,6	675 476,2	65,8	-351 674,4	1 747 505,4	-61,3
Успех каждого ребенка	146 734,5	136 665,2	93,1	-10 069,3	561 760,5	-75,7
Цифровая образовательная среда	285 720,4	282 776,1	99,0	-2 944,3	241 534,7	17,1
Молодые профессионалы	26 722,4	26 722,4	100,0	0,0	26 627,4	0,4
Социальная активность	28 003,7	27 960,9	99,8	-42,8	24 331,4	14,9
Патриотическое воспитание	21 869,2	21 812,0	99,7	-57,2	-	0,0
Жилье	288 138,6	287 588,7	99,8	-549,9	239 397,2	20,1
Формирование комфортной городской среды в Иркутской области	1 553 394,7	1 540 485,5	99,2	-12 909,2	1 566 653,4	-1,7
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	3 491 206,5	1 435 942,4	41,1	-2 055 264,1	283 370,3	406,7
Чистая вода	567 835,5	567 835,4	100,0	-0,1	253 664,5	123,9
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	18 388,9	18 382,5	100,0	-6,4	149 267,8	-87,7
Чистый воздух	143 598,3	143 593,4	100,0	-4,9	150 632,0	-4,7
Озеро Байкал	3 090 870,6	3 090 629,0	100,0	-241,6	2 028 749,1	52,3
Сохранение лесов	343 234,9	343 234,9	100,0	0,0	205 049,7	67,4
Поддержка самозанятых	6 452,4	6 452,4	100,0	0,0	1 069,7	503,2
Предакселерация	24 042,8	24 042,7	100,0	-0,1	229 276,3	-89,5
Акселерация субъектов МСП	300 900,3	300 900,0	100,0	-0,3	220 914,4	36,2
Развитие туристической инфраструктуры	736 991,1	272 489,8	37,0	-464 501,3	-	0,0
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	16 883,9	16 883,9	100,0	0,0	9 896,5	70,6
Первичная медико-санитарная помощь	200 276,9	200 276,9	100,0	0,0	202 335,3	-1,0
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	321 456,9	301 115,5	93,7	-20 341,3	394 614,4	-23,7
Борьба с онкологическими заболеваниями	296 472,2	128 026,1	43,2	-168 446,1	831 954,6	-84,6
Детское здравоохранение Иркутской области	42 500,0	42 498,1	100,0	-1,9	302 112,8	-85,9
Медицинские кадры Иркутской области	24 958,0	24 932,1	99,9	-25,9	24 010,1	3,8
Цифровой контур здравоохранения	195 307,5	194 913,2	99,8	-394,3	783 888,5	-75,1
Финансовая поддержка семей при рождении детей	6 288 769,9	6 288 717,0	100,0	-53,0	5 942 670,0	5,8
Содействие занятости	2 574 291,5	1 078 748,9	41,9	-1 495 542,7	1 400 392,4	-23,0
Старшее поколение	140,7	139,6	99,2	-1,1	122 065,0	-99,9
Укрепление общественного здоровья	680,0	680,0	100,0	0,0	800,0	-15,0
Спорт - норма жизни	297 124,8	221 385,7	74,5	-75 739,1	498 541,2	-55,6
Дорожная сеть	9 801 202,9	9 322 206,4	95,1	-478 996,5	7 490 101,2	24,5
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	78 429,8	63 749,7	81,3	-14 680,2	135 988,1	-53,1
Безопасность дорожного движения	164 946,5	108 814,2	66,0	-56 132,3	822,2	13 134,5
Экспорт продукции АПК	300 136,1	299 246,7	99,7	-889,4	82 530,0	262,6
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	580,0	580,0	100,0	0,0	-	0,0

Исполнение осуществлялось по всем РП в январе-декабре 2021 года.

КСП области отмечает, что Законом Иркутской области № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции Закона № 133-ОЗ от 17.12.2021 не предусмотрены средства областного бюджета на реализацию РП «Учитель будущего» в сумме 18 388,9 тыс. р.

Расходы областного бюджета сформированы по программно-целевому принципу. В 2021 году реализовывается 21 ГП, в рамках 17 ГП учтены средства РП.

Объем расходов ГП и РП по состоянию на 01.01.2022 согласно уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета отражен в таблице.

тыс. р.

№	Наименование	КЦСР	Объем ГП	Объем РП	Доля РП в ГП, %
1	Развитие образования	5100000000	68 223 302,1	4 020 700,2	5,9
2	Развитие здравоохранения	5200000000	42 044 725,1	1 081 792,1	2,6
3	Социальная поддержка населения	5300000000	46 483 419,7	6 288 769,9	13,5
4	Развитие физической культуры и спорта	5400000000	2 451 769,7	297 124,8	12,1
5	Развитие культуры	5500000000	3 126 523,1	88 772,8	2,8
6	Молодежная политика	5600000000	227 534,6	43 479,6	19,1
7	Труд и занятость	5700000000	2 194 835,9	46 312,5	2,1
8	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области	6100000000	11 520 869,3	3 463 125,4	30,1
9	Развитие транспортного комплекса Иркутской области	6200000000	1 732 613,4		0,0
10	Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства	6300000000	17 841 650,3	9 879 632,7	55,4
11	Доступное жилье	6400000000	8 772 217,6	3 779 345,1	43,1
12	Охрана окружающей среды	6500000000	5 754 900,9	357 567,9	6,2
13	Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город	6600000000	1 874 434,6	164 946,5	8,8
14	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	6800000000	6 565 088,5	469 249,8	7,1
15	Реализация государственной национальной политики в Иркутской области	6900000000	39 788,7		0,0
16	Управление государственными финансами Иркутской области	7000000000	15 166 016,1		0,0
17	Экономическое развитие и инновационная экономика	7100000000	3 784 983,0	1 027 510,1	27,1
18	Формирование современной городской среды	7200000000	1 553 394,7	1 553 394,7	100,0
19	Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области	7400000000	1 386 416,7		0,0
20	Развитие юстиции и правовой среды	7500000000	1 167 049,4	32 034,3	2,7
21	Развитие лесного хозяйства	7700000000	3 595 104,2	343 234,9	9,5
Всего			245 506 637,6	32 936 993,3	13,4

Как видно из таблицы, удельный вес финансового обеспечения РП в ГП составляет 13,4%. Наибольший удельный вес РП в общем объеме финансового обеспечения госпрограммы приходится на ГП «Формирование современной городской среды» (100,0%), ГП «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» (55,4%), ГП «Доступное жилье» (43,1%).

В составе 4 ГП реализация РП не предусмотрена, в том числе:

- ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»;
- ГП «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»;
- ГП «Управление государственными финансами Иркутской области»;
- ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»;

Наибольшее количество РП предусмотрено в рамках ГП «Развитие здравоохранения» - 8 РП, ГП «Развитие образования» - 6 РП, ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 6 РП.

В целом на реализацию РП предусмотрено 32 936 993,3 тыс. р. в том числе средства ФБ 17 300 214,5 тыс. р. ОБ – 12 452 767,2 тыс. р. Фонда ЖКХ – 3 184 011,6 тыс. р. Исполнение на 01.01.2022 составило в целом - 17 727 483,3 тыс. р. в том числе ФБ – 16 234 577,5 тыс. р. ОБ – 10 183 060,8 тыс. р. Фонд ЖКХ- 1 309 845,1 тыс. р.

Реализация РП по состоянию на 01.01.2022 осуществляется 16 главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Исполнение РП, в том числе по федеральным и областным источникам, отражено в таблице.

тыс. р.

ГРБС	код	Р П	Всего на 01.01.2022 - СБР			Факт на 01.01.2022			% исп.
			всего	в т. ч. ФБ	ОБ	всего	в т. ч. ФБ	ОБ	всего
Министерство спорта	801	1	78 011,8	61 703,3	16 308,5	76 802,2	60 610,6	16 191,6	98,4
Министерство здравоохранения	803	9	1 081 910,5	901 208,6	180 701,9	892 699,8	712 832,9	179 866,9	82,5
Министерство культуры и архивов	804	3	61 500,0	61 000,0	500,0	61 500,0	61 000,0	500,0	100,0
Министерство труда и занятости	805	1	46 312,5	19 200,0	27 112,5	32 373,0	19 200,0	13 173,0	69,9
Министерство социального развития, опеки и попечительства	806	1	6 288 769,9	4 960 535,1	1 328 234,8	6 288 717,0	4 960 486,0	1 328 231,0	100,0
Министерство образования	807	6	768 340,0	547 930,5	220 409,5	753 627,8	542 498,0	211 129,8	98,1
Министерство сельского хозяйства	809	2	373 686,5	319 148,4	54 538,1	372 797,0	319 148,4	53 648,6	99,8
Министерство жилищной политики, энергетики	812	5	5 030 382,6	4 408 379,9	622 002,7	5 017 468,4	4 400 619,9	616 848,5	99,7
Министерство строительства	814	9	9 428 071,3	2 756 757,5	3 487 302,2	5 001 647,4	1 934 388,0	1 757 414,3	53,1
Министерство природных ресурсов и экологии	815	1	357 567,9	353 201,3	4 366,6	357 319,9	353 194,8	4 125,2	99,9
Аппарат Губернатора и Правительства	827	2	15 210,0	0,0	15 210,0	15 210,0	0,0	15 210,0	100,0
Министерство экономического развития и промышленности	831	5	275 309,0	172 603,2	102 705,8	275 308,7	172 603,2	102 705,5	100,0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства	835	3	8 713 172,5	2 357 670,5	6 355 502,0	8 163 363,5	2 317 145,8	5 846 217,7	93,7
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей	837	1	32 034,3	30 752,9	1 281,4	32 034,2	30 752,9	1 281,4	100,0
Министерство лесного комплекса	843	1	343 234,9	343 234,9	0,0	343 234,9	343 234,9	0,0	100,0
Министерство по молодежной политике	844	2	43 479,6	6 888,4	36 591,2	43 379,6	6 862,2	36 517,4	99,8
Всего			32 936 993,3	17 300 214,5	12 452 767,2	27 727 483,3	16 234 577,5	10 183 060,8	84,2

Утвержденные ассигнования областного бюджета в январе-декабре 2021 года в объеме 32 936 993,3 тыс. р. планировалось направить на реализацию по следующим видам расходов (таблица).

тыс. р.				
КВР	СБР на 01.01.2022	Факт на 01.01.2022	% исп.	Доля КВР в общем объеме, %
100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	10 428,2	10 421,6	99,9	0,0
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	7 789 787,6	7 151 914,5	91,8	25,8
300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	6 441 531,2	6 421 694,0	99,7	23,2
400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	2 329 613,3	1 841 064,9	79,0	6,6
500 «Межбюджетные трансферты»	14 637 099,3	10 575 476,1	72,3	38,1
600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	1 215 524,3	1 215 103,1	100,0	4,4
800 «Иные бюджетные ассигнования»	513 009,3	511 809,2	99,8	1,8
Всего	32 936 993,3	27 727 483,3	84,2	x

Как видно из таблицы, наибольший объем расходов в сумме 10 575 476,1 тыс. р. или 38,1 % от общего объема исполненных ассигнований приходится на КВР 500 «Межбюджетные трансферты».

Объем средств МБТ по РП и их исполнение на 01.01.2022 представлено в таблице.

тыс. р.				
Наименование	Объем средств на РП	Фактическое использование	% исполнения	Остаток
Областной бюджет	32 936 993,3	27 727 483,3	84,2	5 209 509,92
из них:	14 637 099,3	10 575 476,1	72,3	4 061 623,24
МБТ местным бюджетам				

Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе РП и мероприятий по состоянию на 01.01.2022 представлено в Приложении 3.

Межбюджетные трансферты предусмотрены в 14 РП (14 637 099,3 тыс. р.), процент исполнения на 01.01.2022 (10 575 476,1 тыс. р.) составил 72,3%.

По состоянию на 01.01.2022 не осуществлялось финансирование МБТ по 1 мероприятию РП «Современная школа». Исполнение по МБТ на 01.10.2021 составило 72,3% от общего утвержденного объема МБТ.

В соответствии с формами отчетности 0503117-НП в бюджетах МО Иркутской области в январе-декабре 2021 года объем бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию РП, с учетом софинансирования местных бюджетов, составил 17 183 531,6 тыс. р. исполнено на 01.01.2022 - 12 383 930,0 тыс. р. или 72,1%.

Распределение между МО бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию региональных проектов, с учетом софинансирования местных бюджетов на 01.01.2022 отражено в Приложении 4.

Полное неосвоение средств РП отмечено по трем МО: Еланцынское сельское поселение (1868,8 тыс. р.), Тельминское городское поселение (1436,1 тыс. р.), Уховское сельское поселение (344,9 тыс. р.).

Низкое освоение средств РП отмечено по следующим МО: городской округ Тулун (план 270 629,3 тыс. р., факт 51 243,8 тыс. р., или 18,9%), Карлукское сельское поселение (план 55 384,2 тыс. р., факт 3 971,7 тыс. р., или 7,2%).

Менее 60% средств РП освоено следующими МО (таблица).

тыс. р.

Наименование МО	План	Факт	% исп
Белореченское городское поселение	9 609,3	5 076,4	52,8
Большееланское сельское поселение	3 707,7	2 122,8	57,3
Городской округ Иркутск	12 929 594,1	6 089 280,2	47,1
Городской округ Свирск	79 182,1	33 113,3	41,8
Городской округ Черемхово	684 157,4	245 088,4	35,8
Каразейское сельское поселение	738,8	407,2	55,1
Карымское сельское поселение	2 984,2	1 584,2	53,1
Куйтунское городское поселение	8 267,0	3 954,2	47,8
Мамское городское поселение	70 837,8	41 101,0	58
Мишелевское городское поселение	7 952,1	4 468,3	56,2
Нижнеудинское городское поселение	1 079 225,4	563 475,1	52,2
Шелеховское городское поселение	367 435,3	202 128,2	55

Основные выводы

1. В Иркутской области утверждены паспорта 51 регионального проекта в рамках 11 национальных проектов, в анализируемом периоде финансовое обеспечение предусмотрено по 41 региональному проекту.

2. Объем бюджетных средств на реализацию РП составляет 32 936 993,3 тыс. р. или 13,3% от общего объема расходов областного бюджета (246 805 076,8 тыс. р.). Исполнение расходов по РП на 01.01.2022 составило 27 727 483,2 тыс. р. или 84,2%.

3. Анализ размещенных данных выявил неполноту заполнения отдельных показателей в ГИИС «Электронный бюджет», не указан объем финансового обеспечения на 2021 год по паспорту РП «Жилье» на реализацию мероприятий. Также по РП «Социальная активность», «Современная школа», «Содействие занятости», «Дорожная сеть» и «Безопасность дорожного движения» в ЭБ отражаются некорректные данные в разделе 5 «Сведения об исполнении бюджета» Финансовое обеспечение, кассовое исполнение на 01.01.2022.

Общее количество замечаний к формированию параметров РП составляет 759 ед. в том числе со статусом: «ошибки» - 2 ед. «предупреждение» - 757 ед.

Отмечены риски при реализации 18 РП, связанные с некритическими отклонениями по показателям и результатам.


4. Межбюджетные трансферты предусмотрены в 14 РП (14 637 099,3 тыс. р.), процент исполнения на 01.01.2022 (10 575 476,1 тыс. р.) составил 72,3%.

5. С учетом софинансирования средств местных бюджетов объем бюджетных ассигнований на реализацию РП в муниципальных образованиях составил 21 382 376,4 тыс. р. исполнено на 01.01.2022 - 12 431 731,3 тыс. р. или 58,1%.

Предложения

1. Направить заключение в Законодательное Собрание Иркутской области.
2. Направить заключение Губернатору Иркутской области.

Председатель



И. П. Морохоева

Распределение показателей и результатов в разрезе региональных проектов

ед.

Код РП	Наименование ФП	Всего показателей	Без отклонений	С некритическими отклонениями	Всего результатов	Без отклонений	С некритическими отклонениями
A1	Культурная среда	2	2	0	5	5	0
A2	Творческие люди	3	3	0	6	6	0
A3	Цифровая культура	0	0	0	1	1	0
D2	Информационная инфраструктура	2	2	0	2	2	0
D4	Информационная безопасность	0	0	0	2	2	0
D6	Цифровое государственное управление	9	9	0	1	1	0
E1	Современная школа	1	1	0	20	20	0
E2	Успех каждого ребенка	4	4	0	16	16	0
E4	Цифровая образовательная среда	4	4	0	6	6	0
E6	Повышение конкурентоспособности профессионального образования	3	3	0	10	10	0
E8	Социальная активность	1	1	0	11	11	0
EB	Патриотическое воспитание граждан РФ	0	0	0	6	6	0
F1	Жилье	2	1	1	2	2	0
F2	Формирование комфортной городской среды в Иркутской области	9	9	0	5	5	0
F3	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	2	2	0	1	1	0
F5	Чистая вода	3	2	1	2	1	1
G4	Чистый воздух	5	4	1	4	3	1
G7	Сохранение озера Байкал	2	2	0	2	2	0
GA	Сохранение лесов	4	3	1	4	4	0
I2	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	1	1	0	5	3	2
I4	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	0	0	0	8	7	1
I5	Акселерация субъектов МСП	0	0	0	12	10	2
L2	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	12	12	0	3	3	0
N1	Первичная медико-санитарная помощь	10	9	1	9	9	0
N2	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	6	1	5	8	8	0
N3	Борьба с онкологическими заболеваниями	4	1	3	7	7	0
N4	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	13	11	2	14	13	1
N5	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	10	1	9	8	4	4
N7	Цифровой контур здравоохранения	6	4	2	9	7	2
P1	Финансовая поддержка семей при рождении детей	0	0	0	11	11	0
P2	Содействие занятости	2	0	2	4	3	1
P3	Старшее поколение	5	4	1	5	4	1
P4	Укрепление общественного здоровья	2	2	0	1	1	0
P5	Спорт-норма жизни	2	2	0	4	3	1
R1	Дорожная сеть	3	3	0	2	2	0
R2	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	2	2	0	3	2	1
R3	Безопасность дорожного движения	2	0	2	14	13	1
T2	Экспорт продукции АПК	1	1	0	9	9	0
T6	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	1	0	1	2	2	0
	Всего	138	106	32	244	225	19

Информация о наличии отклонений по показателям и результатам региональных проектов на 01.01.2022

Наименование РП	Наличие некритических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
(F1) Жилье	по показателю РП	Наименование показателя: "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" Плановое значение: 0,0925 Фактическое значение 0,09417. Существует риск: невод жилья, Причина риска: Неввод жилья в п. Хрустальный парк возник в связи с введением 7 подзоны. Устранить планируется до марта 2022 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г. Принятые меры: 1. ведется работа с муниципальным образованием, срок исполнения 31.03.2022. Отклонения будут устранены до 31.03.2022 г.	Лобач А. Т.
(F5) Чистая вода	по показателю РП	Наименование показателя: "Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами" Плановое значение: 5. Фактическое значение: 4. Существует риск: По мероприятию "Строительство объекта водоснабжения "Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, производительностью 2500-3000 м3/сут", г.Вихоревка" . , Причина риска: В связи с перепрохождением экспертизы связанной с удорожанием материалов строительства. Недобросовестный подрядчик. Вероятность: 100%, Сутевые: Финансирование перенесено на 2022 год. Муниципальный контракт расторгнут. В связи с перепрохождением экспертизы связанной с удорожанием материалов строительства. Принятые меры: 1. финансирование перенесено на 2022 год; Муниципальный контракт расторгнут. срок исполнения 31.12.2022. Согласно дополнительному соглашению № 069-2020-F5001-56/1.1 от 29.12.2021 в связи с уменьшением лимитов финансирования были скорректированы плановые значения на 4. После внесения изменения в федеральный паспорт будут актуализированы значения и создан уточняющий отчет.	Ветров Е. П.
	по значению результата РП	Наименование: "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом" Плановое значение: 5. Фактическое значение: 4. Существует риск: По мероприятию "Строительство объекта водоснабжения "Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, производительностью 2500-3000 м3/сут", г.Вихоревка" . , Причина риска: В связи с перепрохождением экспертизы связанной с удорожанием материалов строительства. Недобросовестный подрядчик. Вероятность: 100%, Сутевые: Финансирование перенесено на 2022 год. Муниципальный контракт расторгнут. В связи с перепрохождением экспертизы связанной с удорожанием материалов строительства. Принятые меры: 1. финансирование перенесено на 2022 год; Муниципальный контракт расторгнут, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено. По мероприятию "Строительство объекта водоснабжения "Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, производительностью 2500-3000 м3/сут", г.Вихоревка" финансирваение перенесено на 2022 год. Муниципальный контракт расторгнут. Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 4 из 5.	
(G4) Чистый воздух	по показателю РП	Наименование показателя: "Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год" Плановое значение: 1,36. Фактическое значение: 0,8. Существует риск: Не достижение значения показателя по г. Братску, Причина риска: Отсутствие финансирования из ФБ. Необходимость корректировки значений показателя. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Скорректировать значение показателя, срок исполнения 31.12.2021. Риск	Трофимова С. М.

Наименование РП	Наличие не критических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
		недостижения показателя (отсутствует необходимое количество ТС, работающих на газе)	
	по значению результата РП	Наименование: "Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021" Существует риск: Не достижение показателей и результатов федерального и регионального проектов "Чистый воздух", Причина риска: Отсутствие финансирования из федерального бюджета, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2021г. Принятые меры: 1. Минприроды России обеспечить финансирование из федерального бюджета мероприятий регионального проекта "Чистый воздух", срок исполнения 01.06.2021. В 2021 году закуплено 4 автобуса и 8 ед. коммунальной техники, работающих на природном газе, 2 ПАГЗа. Начато строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в Правобережном районе г. Братска (в 2021 году завершен участок от ГРПШ 2 протяженностью 1467 м). Выполнены работы по подключению 29 домовладений к сетям газоснабжения. Просрочка 1 день.	
(GA) Сохранение лесов	по показателю РП	Наименование: "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" Плановое значение: 86,4 Фактическое значение 102,7	Данилова А. Н.
(I2) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	по значению результата РП	Наименование: "Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (указать количество объектов) Значение: 18,0" План: 18. Факт: 1. Существует риск: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, не менее чем на 10% ежегодно нарастающим итогом. Причина риска: Муниципальные образования Иркутской области оказывают имущественную поддержку самозанятым. В связи с тем, что заявок от самозанятых граждан не поступает, показатель по состоянию на 31.12.2021 год не исполнен в полном объеме. Вероятность: 90%, Суточные: значение показателя не выполнено в 2021 году в связи с тем, что самозанятые граждане не обращались за имущественной поддержкой Принятые меры: 1. Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области направлены письма в муниципальные образования Иркутской области о необходимости оказания имущественной поддержки для самозанятых граждан до конца 2021 года, срок исполнения 31.12.2021, значение показателя не выполнено в 2021 году в связи с тем, что самозанятые граждане не обращались за имущественной поддержкой. Просрочка 1 день.	Гордеев В. Н.
		Наименование: "Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, не менее чем на 10% ежегодно нарастающим итогом. Значение: 10,0" План: 10. Факт: 0,6. Существует риск: (22) Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, не менее чем на 10% ежегодно нарастающим итогом. Причина риска: Муниципальные образования Иркутской области оказывают имущественную поддержку самозанятым. В связи с тем, что заявок от самозанятых граждан не поступает, показатель по состоянию на 31.12.2021 год не исполнен в полном объеме. Вероятность: 90%, Суточные: значение результата не выполнено в 2021 году в связи с тем, что самозанятые граждане не обращались за имущественной поддержкой Принятые меры: 1. Министерством экономического	

Наименование РП	Наличие некритических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
		развития и промышленности Иркутской области направлены письма в муниципальные образования Иркутской области о необходимости оказания имущественной поддержки для самозанятых граждан до конца 2021 года, срок исполнения 31.12.2021, значение показателя не выполнено в 2021 году в связи с тем, что самозанятые граждане не обращались за имущественной поддержкой. Просрочка 61 день.	
(I4) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	по значению результата РП	Наименование: "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) Значение: 10,05" Существует риск: По техническим причинам система не позволяет внести фактический показатель, который превышает плановый (19187), так как, не были внесены изменения в рабочий план по КТ. Значение закроется в следующем отчетном периоде, в январе, вместе с изменениями в рабочем плане. Причина риска: По техническим причинам система не позволяет внести фактический показатель, который превышает плановый (19187), так как, не были внесены изменения в рабочий план по КТ. Значение закроется в следующем отчетном периоде, в январе, вместе с изменениями в рабочем плане. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2022г. Принятые меры: 1. По техническим причинам система не позволяет внести фактический показатель, который превышает плановый (19187), так как, не были внесены изменения в рабочий план по КТ. Значение закроется в следующем отчетном периоде, в январе, вместе с изменениями в рабочем плане. Фактический показатель на 20.12.2021 составил 19,187. по техническим причинам система не позволяет внести фактический показатель, который превышает плановый (19,187), так как, не были внесены изменения в рабочий план по КТ. Значение закроется в следующем отчетном периоде, в январе, вместе с изменениями в рабочем плане. Просрочка 12 дней.	Иванова А. А.
(I5) Акселерация субъектов МСП	по значению результата РП	Наименование: " Увеличение количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъекте Российской Федерации (ежегодно не менее чем на 10%) Значение: 0,6520." План 0,65. Факт 0,5390. Существует риск: Недостижение показателя по увеличению перечня имущества , Причина риска: Отсутствие ликвидного имущества в региональной и муниципальной собственности для включение в перечень имущества для дальнейшего предоставления СМСП, Вероятность: 80%, Сутевые: Отсутствие ликвидного имущества в региональной и муниципальной собственности для включение в перечень имущества для дальнейшего предоставления СМСП Принятые меры: 1. Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области неоднократно направлялись письма в муниципальные образования Иркутской области об увеличении перечня имущества. срок исполнения 31.12.2021, Недостижение планового значения показателя в связи с отсутствием ликвидного имущества в региональной и муниципальной собственности для включение в перечень имущества для дальнейшего предоставления СМСП . Просрочка 1 день. Наименование: " Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества Значение: 0,1420" План: 0,14. Факт: 0,1160. Существует риск: Недостижение показателя по предоставлению имущества СМСП, Причина риска: Отсутствие обращений СМСП за предоставлением имущество, либо имущество из сформированного перечня не пользуется спросом. Вероятность: 80%, Сутевые: Отсутствие обращений СМСП за предоставлением имущество, либо имущество из сформированного перечня не пользуется спросом. Принятые меры: 1. Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области направлены письма в муниципальные образования Иркутской области о	Иванова А. А.

Наименование РП	Наличие некритических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
		необходимости оказания имущественной поддержки СМСП до конца 2021 года, срок исполнения 31.12.2021, Отсутствие обращений СМСП за предоставлением имущество, либо имущество из сформированного перечня не пользуется спросом. Выполнено. Просрочка 1 день.	
(N1) Первичная медико-санитарная помощь	по показателю РП	Наименование: "Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году" План: 10. Факт: 0. Существует риск: показатель удален из ФП, Причина риска: показатель удален из ПФ, после синхронизации (ЗНИ) из РП также уйдет, Вероятность: 10%, Суточные: показатель удален из ПФ, после синхронизации (ЗНИ) из РП также уйдет Принятые меры: 1. МЗИО создаст ЗНИ, срок исполнения 31.01.2022.	
(N2) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	по показателю РП	Наименование: "Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед." план 4,775. Факт: 2,449. Существует риск: Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. Причина риска: В связи с неблагоприятной эпидобстановкой по новой коронавирусной инфекции оказание плановой медицинской помощи было приостановлено, Вероятность: 100%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. При улучшении эпидобстановки по новой коронавирусной инфекции показатель будет достигнут, срок исполнения 01.04.2022, при улучшении эпидобстановки показатель будет достигнут. Приостановление плановой медицинской помощи, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией covid-19 повлияло на достижение данного показателя.	
		Наименование: " Больничная летальность от инфаркта миокарда" План: 10. Факт: 11,7. Существует риск: превышение показателя Больничная летальность от инфаркта миокарда, Причина риска: Недостижение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда, %» в 2021 году обусловлено тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вероятность: 100%, Суточные: недостижение показателя Принятые меры: 1. При установлении благоприятной эпидобстановки по новой коронавирусной инфекции показатель будет достигнут, срок исполнения 01.04.2022. Уточненные сведения будут внесены после сдачи медицинскими организациями, подведомственными МЗ ИО, годового отчета за 2021 год	
		Наименование: "Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения" План :17,9. Факт: 19,2. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: Не достижение показателя «Больничная летальность от ОНМК, %» в 2021 году обусловлено тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вероятность: 100%, Суточные: не достижение показателя, рост смертности от БССС Принятые меры: 1. При нормализации эпидситуации по covid-19 показатель будет достигнут, срок исполнения 01.04.2022. Недостижение показателя «Больничная летальность от ОНМК, %» в 2021 году обусловлено тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне заболевания новой коронавирусной инфекцией.	
		Наименование: "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением" План: 50. Факт: 49,4. Существует риск: Не достижение показателя, Причина риска: Ввиду приостанавливания плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией , Вероятность: 90%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. При нормализации эпидситуации - достижение показателя , срок исполнения 01.04.2022. Уточненные сведения будут	

Наименование РП	Наличие некритических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
		внесены после сдачи медицинскими организациями годового отчета за 2021 год Наименование: "Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)" План: 1,75. Факт: 2,9. Существует риск: Не достижение показателя, Причина риска: Не достижение показателя «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением» в 2021 году обусловлено тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вероятность: 100%, Суточные: Показатель не достигнут, рост смертности от БССС Принятые меры: 1. При нормализации эпидситуации по новой коронавирусной инфекции возможно достижение данного показателя, срок исполнения 01.04.2022. Недостижение показателя «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением» в 2021 году обусловлено тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне заболевания новой коронавирусной инфекцией.	
(N3) Борьба с онкологическими заболеваниями	по показателю РП	Наименование: "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)" План: 23,1. Факт: 26,8. Существует риск: Одногодичная летальность, Причина риска: Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией covid-19 усугубляет течение онкологических заболеваний, Вероятность: 100%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. приобретена компьютерная программа «Онкор», планируется поэтапное внедрение, срок исполнения 01.04.2022. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией covid-19 усугубляет течение онкологических заболеваний.	Данилова А. Н.
	по показателю РП	Наименование: "Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением". План: 66. Факт: 48,9. Существует риск: доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и / или лечение в текущем году из числа состоящих по диспансерным наблюдением, %, Причина риска: Рост числа заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, Вероятность: 100%, Суточные: Показатель не достигнут Принятые меры: 1. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и / или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением увеличится при улучшении эпидобстановки по новой коронавирусной инфекции, срок исполнения 01.06.2022. Ввиду роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией данный показатель в 2021 году не достигнут	
	по показателю РП	Наименование: "Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях". План: 54,5. Факт: 52,8. Существует риск: Доля ЗНО, выявленных на I-II ст. Причина риска: Ввиду высокой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией были приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация, плановые приемы в связи с чем выявляемость ЗНО на ранних стадиях снизилась, Вероятность: 100%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. Проводится углубленная диспансеризация переболевших новой коронавирусной инфекцией, что позволит повысить выявляемость ЗНО на ранних стадиях, срок исполнения 01.04.2022.	
(N4) Развитие детского здравоохранения,	по показателю РП	Наименование: "Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям" План: 95. Факт: 96,7. Не указан тип показателя, из-за этого выходит риск, Вероятность: 10%, Суточные: Показатель достигнут.	Данилова А. Н.

Наименование РП	Наличие не критических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям		Не указан тип показателя, из-за этого выходит риск Принятые меры: 1. МЗИО будет создан ЗНИ для устранения ошибки, срок исполнения 31.01.2022. исполнено	
	по показателю РП	Наименование: "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами" План: 86,45. Факт: 86,2. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: уточненные сведения об укомплектованности мед.организаций будут известны после сдачи годового отчета, Вероятность: 10%, Сутевые: уточненные сведения об укомплектованности мед.организаций будут известны после сдачи годового отчета Принятые меры: 1. проходит прием годовых отчетов, срок исполнения 15.02.2022.	
	по значению результата РП	Наименование: "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами Значение: 92,00" План: 92. Факт: 67,7. Существует риск: значение результата не достигнуто, Причина риска: В связи со сложной эпид.обстановкой проведение проф.осмотров было приостановлено, Вероятность: 30%, Сутевые: значение результата не достигнуто. В связи со сложной эпид.обстановкой проведение проф.осмотров было приостановлено Принятые меры: 1. проф.осмотры возобновлены, срок исполнения 16.08.2021. Просрочка 1 день.	
(N5) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	по показателю РП	Наименование: "Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения" План: 40,9. Факт: 36,72. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: В 2021 году выпуск студентов, обучавшихся в рамках квоты целевого приема, составил 191 человек, из них: 113 заключили трудовой договор с медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации), 3 находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 22 продолжили обучение по программам ординатуры, 3 освобождены от исполнения обязательств по договору по уважительной причине (состояние здоровья, уход за родственниками, имеющими инвалидность) и 22 человека не исполнили обязательства по трудоустройству. В настоящее время в отношении выпускников, не исполнивших обязательства по трудоустройству, медицинскими организациями проводится претензионная работа в соответствии с законодательством Российской Федерации по взысканию расходов, связанных с предоставлением мер поддержки. Вероятность: 10%, Сутевые: показатель не достигнут Принятые меры: 1. проводится претензионная работа, срок исполнения 01.01.2022.	Синькова Г. М.
	по показателю РП	Наименование: "Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками" План: 83,5. Факт: 81,6. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: в связи со сложной эпид.ситуацией, большое кол-во специалистов перешли работать в ковидные центры, Вероятность: 10%, Сутевые: показатель не достигнут Принятые меры: 1. -, срок исполнения 01.01.2022.	
	по показателю РП	Наименование: "Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения" План: 21,2. Факт: 20,19. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: в связи со сложной эпид.ситуацией, большое кол-во специалистов перешли работать в ковидные центры. Вероятность: 10%, Сутевые: показатель не достигнут Принятые меры: 1. -, срок исполнения 01.01.2022. не влияет на другие параметры	

Наименование РП	Наличие не критических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
	по показателю РП	Наименование: "Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения" План: 8. Факт: 7,42. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: в связи со сложной эпид.ситуацией, большое кол-во специалистов перешли работать в ковидные центры. Вероятность: 10%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. -, срок исполнения 01.01.2022.	
	по показателю РП	Наименование: "Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения" План: 15,8. Факт: 14,92. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: в связи со сложной эпид.ситуацией, большое кол-во специалистов перешли работать в ковидные центры. Вероятность: 20%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. -, срок исполнения 01.01.2022.	
	по показателю РП	Наименование: "Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения" План: 97,1. Факт: 90,46. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: В 2021 году выпуск студентов, обучавшихся в рамках квоты целевого приема, составил 191 человек, из них: 113 заключили трудовой договор с медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации), 3 находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 22 продолжили обучение по программам ординатуры, 3 освобождены от исполнения обязательств по договору по уважительной причине (состояние здоровья, уход за родственниками, имеющими инвалидность) и 22 человека не исполнили обязательства по трудоустройству. В настоящее время в отношении выпускников, не исполнивших обязательства по трудоустройству, медицинскими организациями проводится претензионная работа в соответствии с законодательством Российской Федерации по взысканию расходов, связанных с предоставлением мер поддержки. Вероятность: 20%, Суточные: показатель не достигнут	
	по показателю РП	Наименование: "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)" План: 79,8. Факт: 77,69. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: в связи со сложной эпид.ситуацией, большинство специалистов уходят работать в ковидные центры, Вероятность: 10%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. проводится целевой набор, выделяется жилье мед.работникам, разные меры соц.поддержки, срок исполнения 31.12.2022. не влияет на другие параметры	
	по показателю РП	Наименование: "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий" План: 25,63. Факт: 25,31. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: в связи с высокой загруженностью специалистов (из-за сложной эпид.ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией), непрерывное обучение проводилось реже, Вероятность: 10%, Суточные: показатель не достигнут Принятые меры: 1. -, срок исполнения 01.01.2022.	
	по показателю РП	Наименование: "Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %" План: 22,5. Факт: 6,58. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: В связи со сложной эпидемической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, был введен мораторий на	

Наименование РП	Наличие не критических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
		проведение процедуры аккредитации до 1 июня 2021 года (Приказ Минздрава России от 08.02.2021 N 58н (ред. от 22.07.2021) "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году" (вместе с "Случаями и условиями, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году"). В связи с этим, продлен срок действия сертификатов специалистов на 12 месяцев. В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся процедуры первичной аккредитации. , Вероятность: 40%, Сутовые: показатель не достигнут	
	по значению результата РП	Наименование: "Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области составляет не менее 10351 и 24367 специалистов соответственно" План: 9,71. Факт: 8,72. Существует риск: недостижение значения результата, Причина риска: В 2021 году выпуск студентов, обучавшихся в рамках квоты целевого приема, составил 191 человек, из них: 113 заключили трудовой договор с медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации), 3 находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 22 продолжили обучение по программам ординатуры, 3 освобождены от исполнения обязательств по договору по уважительной причине (состояние здоровья, уход за родственниками, имеющими инвалидность) и 22 человека не исполнили обязательства по трудоустройству. В настоящее время в отношении выпускников, не исполнивших обязательства по трудоустройству, медицинскими организациями проводится претензионная работа в соответствии с законодательством Российской Федерации по взысканию расходов, связанных с предоставлением мер поддержки. Вероятность: 20%, Сутовые: значение показателя не достигнуто Принятые меры: 1. выделяется жилье, соц.выплаты производятся и др, срок исполнения 01.01.2022. значение результата не достигнуто	
	по значению результата РП	Наименование: "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом" План: 23,04. Факт: 21,44. Существует риск: недостижение значения результата, Причина риска: В 2021 году выпуск студентов, обучавшихся в рамках квоты целевого приема, составил 191 человек, из них: 113 заключили трудовой договор с медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации), 3 находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 22 продолжили обучение по программам ординатуры, 3 освобождены от исполнения обязательств по договору по уважительной причине (состояние здоровья, уход за родственниками, имеющими инвалидность) и 22 человека не исполнили обязательства по трудоустройству. В настоящее время в отношении выпускников, не исполнивших обязательства по трудоустройству, медицинскими организациями проводится претензионная работа в соответствии с законодательством Российской Федерации по взысканию расходов, связанных с предоставлением мер поддержки. Вероятность: 10%, Сутовые: не достигнуто значение показателя Принятые меры: 1. выделяется жилье, соц.выплаты и др, срок исполнения 01.01.2022. не достигнуто значение результата	

Наименование РП	Наличие не критических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
	по значению результата РП	Наименование: "Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов" План: 12,31. Факт: 1,95. Существует риск: недостижение значения результата, Причина риска: В связи со сложной эпидемической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, был введен мораторий на проведение процедуры аккредитации до 1 июня 2021 года (Приказ Минздрава России от 08.02.2021 N 58н (ред. от 22.07.2021) "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году" (вместе с "Случаями и условиями, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году"). В связи с этим, продлен срок действия сертификатов специалистов на 12 месяцев. В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся процедуры первичной аккредитации. , Вероятность: 50%, Сутевые: значение результата не достигнуто Принятые меры: 1. -, срок исполнения 01.01.2022.	
	по значению результата РП	Наименование: "Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек " План: 25,63. Факт: 25,31. Существует риск: недостижение значения результата, Причина риска: в связи с высокой загруженностью специалистов, связанной с тяжелой эпид.ситуацией, обучение проходят не все, Вероятность: 10%, Сутевые: не достигнуто значение результата Принятые меры: 1. -, срок исполнения 01.01.2022.	
(N7) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	по показателю РП	Наименование: "Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно" План: 40. Факт: 25. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: Низкий процент достижения показателя связан с отсутствием технической возможности существующего модуля РМИС для выгрузки информации в федеральный модуль ЕГИСЗ. Ведется работа по доработке модуля с компанией ПАО «Ростелеком», которая является поставщиком услуг по обеспечению функционирования регионального фрагмента ЕГИСЗ для медицинских организаций Иркутской области. На основании письма ПАО «Ростелеком» (исх. 847/21 от 13 мая 2021 г.) развитие действующей версии РМИС приостановлено по причине запланированного ПАО «Ростелеком» перехода на Единую цифровую платформу (далее – ЕЦП). Передача стандартизированных электронных медицинских документов (далее - ЭМД) возможна после перехода на ЕЦП. , Вероятность: 50%, Сутевые: показатель не достигнут Принятые меры: 1. разработана ДК о переходе на ЕЦП 2.0, срок исполнения 01.04.2022.	Данилова А. Н.
	по показателю РП	Наименование: "Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период" План: 48. Факт: 47,1. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: Низкий процент достижения показателя связан с отсутствием технической возможности существующего модуля РМИС для выгрузки информации в федеральный модуль ЕГИСЗ. Ведется работа по доработке модуля с компанией ПАО «Ростелеком», которая является	

Наименование РП	Наличие некритических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
		поставщиком услуг по обеспечению функционирования регионального фрагмента ЕГИСЗ для медицинских организаций Иркутской области. На основании письма ПАО «Ростелеком» (исх. 847/21 от 13 мая 2021 г.) развитие действующей версии РМИС приостановлено по причине запланированного ПАО «Ростелеком» перехода на Единую цифровую платформу (далее – ЕЦП). Передача стандартизированных электронных медицинских документов (далее - ЭМД) возможна после перехода на ЕЦП. Вероятность: 10%, Сутевые: показатель не достигнут Принятые меры: 1. разработана ДК по достижению показателей в 2022 году, срок исполнения 01.04.2022.	
	по значению результата РП	Наименование: "В Иркутской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" План: 1. Факт: 0. Существует риск: перенос срока МЗРФ по достижению данной КТ, Причина риска: перенос срока МЗРФ по достижению данной КТ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. в январе 2022 года будет проведена синхронизация РП с ФП, срок исполнения 20.01.2022.	
	по значению результата РП	Наименование: "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг." План: 39. Факт: 34. Существует риск: Мониторинг достижения результата КТ продолжится в 2022 г. в соответствии с установленным индивидуальным значением, Причина риска: Мониторинг достижения результата КТ продолжится в 2022 г. в соответствии с установленным индивидуальным значением, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Мониторинг достижения результата КТ продолжится в 2022 г. в соответствии с установленным индивидуальным значением, срок исполнения 01.04.2022.	
(Р2) Содействие занятости	по показателю РП	Наименование: "Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом" План: 5,17. Факт: 3,54. Существует риск: Невыполнение показателя, Причина риска: В Дополнительное соглашение № 073-09-2019-156/12 от 23.12.2021 года к Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 г. № 073-09-2019-156 внесены изменения значения результата, но не изменен показатель , Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г. Принятые меры: 1. Работа с Дирекцией Школа 2025, срок исполнения 10.01.2022. В 2021 году согласно Дополнительного соглашения к Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской области о	Парфенов М. А.

Наименование РП	Наличие не критических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 г. № 073-09-2019-156 от 23.12.2021 № 073-09-2019-156/12 изменено значение результата на 2021 год и составляет ввод в эксплуатацию 140 мест. Результат достигнут.	
	по показателю РП	Наименование: "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" План: 86. Факт: 91,18. Снижение процента по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет , Причина риска: Снижение показателя доступности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ФГИС ДДО связано с изменением периодов расчета детей при переходе на новый учебный год , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Работа с МО, срок исполнения 31.10.2021. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 лет до 3 лет (Иркутская область) - 91,18%.	
	по значению результата РП	Наименование: "В Иркутской области созданы не менее 2985 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет" План: 2,98. Факт: 1,4. Согласование ЗНИ, Причина риска: Согласование ЗНИ с ФО, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 03.01.2022г. Принятые меры: 1. Ускорение согласования, срок исполнения 01.01.2022. Заключено дополнительное соглашение с Министерством просвещения об изменении перечня ОКС и изменении значения результата. Создан ЗНИ. В 2021 году введено в эксплуатацию 680 мест	
(РЗ) Старшее поколение	по показателю РП	Наименование: "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста" План: 11,8. Факт: 10,4. Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: Перепрофилирование геронтологических коек под госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2022г.; Суточные: Показатель не будет достигнут Принятые меры: 1. Показатель не достигнут, срок исполнения 01.02.2022, В связи с завершением 2021 года показатель не будет достигнут. Недостижение показателя обусловлено напряженной эпидемиологической ситуацией в Иркутской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и временным перепрофилированием геронтологических коек медицинских организаций под инфекционные для лечения пациентов с COVID-2019.	Родионов В. А.
	по значению результата РП	Наименование: "В Иркутской области на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста " План: 0,57. Факт: 0,50. Существует риск: Недостижение результата, Причина риска: Уточненные данные будут сформированы после приема годовых отчетов медицинских организаций, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2022г. Принятые меры: 1. Прием уточненных данных по отчетам, срок исполнения 01.02.2022. Уточняющий отчет будет сформирован после сдачи годовых отчетов Просрочка 31 день.	
(Р5) Дорожная сеть	по значению	Наименование: "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной)	Золоторева О. Ю.

Наименование РП	Наличие не критических отклонений	Информация по отклонению	Руководитель РП
	результата РП	собственности" План: 1. Факт: 0. Существует риск: Спортивный оздоровительный комплекс в п. Плишкино Иркутского района Иркутской области, Причина риска: Не введен в эксплуатацию по причине не завершения строительства и ввода в эксплуатацию модульной котельной обеспечивающей теплом комплекс и близ лежащие объекты. Строительство объекта ведется администрацией Иркутского района Иркутской области. По информации администрации Хомутовского муниципального образования, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец января 2022 года. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г.; Сутевые: отсутствие ввода в эксплуатацию Принятые меры: 1. ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.03.2022.	
(R2) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	по значению результата РП	Наименование: "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения" План: 6. Факт: 3. Существуют риски: Ввод объектов, Причина риска: Перенос сроков ввода объектов на 2022 год. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Заключено соглашение №103-2019-20038-1/3, срок исполнения 31.12.2022. Перенос ввода объектов на 2022 год, Причина риска: На основании соглашения 103-2019-R20038-1/3 выполнение работ запланировано до конца 2022 года. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Заключено соглашение 103-2019-R20038-1/3, срок исполнения 31.12.2022. Перенос ввода объектов на 2022 год, Причина риска: На основании соглашения 103-2019-R20038-1/3 выполнение работ запланировано до конца 2022 года. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Заключено соглашение 103-2019-R20038-1/3, срок исполнения 31.12.2022. Перенос ввода объектов на 2022 год, Причина риска: На основании соглашения 103-2019-R20038-1/3 выполнение работ запланировано до конца 2022 года. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Заключено соглашение 103-2019-R20038-1/3, срок исполнения 31.12.2022. Перенос ввода объектов на 2022 год, Причина риска: На основании соглашения 103-2019-R20038-1/3 выполнение работ запланировано до конца 2022 года. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Заключено соглашение 103-2019-R20038-1/3, срок исполнения 31.12.2022. Перенос ввода объектов на 2022 год, Причина риска: На основании соглашения 103-2019-R20038-1/3 выполнение работ запланировано до конца 2022 года. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Заключено соглашение 103-2019-R20038-1/3, срок исполнения 31.12.2022. На основании соглашения 103-2019-R20038-1/3 введение объектов запланировано в 2022 году. Просрочка 365 дней.	Золоторева О. Ю.

Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе региональных проектов и мероприятий по состоянию на 01.01.2022

тыс. р.

Наименование		План на 01.01.2022	Факт на 01.01.2022	% исп.
Региональный проект «Культурная среда (Иркутская область)»				
8040801551A154540540	Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек	20 000,0	20 000,0	100,0
8140703551A155197521	Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	8 252,4	8 252,3	100,0
814080168JA155194522	Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности)	95 563,3	95 563,3	100,0
8140801551A155198521	Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры (капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)	19 020,4	19 020,4	100,0
8040801551A15454F540	Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	30 000,0	30 000,0	100,0
Региональный проект «Творческие люди» (Иркутская область)				
8040801553A255196540	Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	1 000,0	1 000,0	100,0
8040801553A255195540	Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры	1 500,0	1 500,0	100,0
Региональный проект «Цифровая культура» (Иркутская область)				
8040801553A354530540	Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов	9 000,0	9 000,0	100,0
Региональный проект «Современная школа»				
8140702511E155201522	Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях	653 371,8	375 166,9	57,4
8140702511E153051522	Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	71 771,0	0,0	0,0
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
8070702513E250971521	Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	111 625,4	101 556,1	91,0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»				
8120503721F254240540	Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	383 922,0	381 998,6	99,5
8120503721F255551523	Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	1 166 372,5	1 156 286,7	99,1
Региональный проект «Жилье (Иркутская область)»				
8140702643F150210522	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	128 115,1	127 876,0	99,8
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)»				
8141403645F367483523	Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию	3 184 011,6	1 309 845,1	41,1

Наименование		План на 01.01.2022	Факт на 01.01.2022	% исп.
	жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			
8141403645F367484523	Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета	307 194,9	126 097,4	41,0
Региональный проект «Чистая вода (Иркутская область)»				
812050261AF552430522	Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	567 835,5	567 835,4	100,0
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Иркутская область)»				
8150605652G252690521	Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	18 388,9	18 382,5	100,0
Региональный проект «Чистый воздух (Иркутская область)»				
8121403615G451081523	Субсидии местным бюджетам на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	104 048,3	104 043,4	100,0
Региональный проект «Озеро Байкал»				
8120502616G750251522	Субсидии местным бюджетам на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал	2 751 691,6	2 751 691,6	100,0
Региональный проект «Содействие занятости»				
8140701511P252321522	Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство, реконструкция объектов образования)	2 016 575,9	534 994,6	26,5
8140701511P252322522	Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (приобретение объектов образования)	490 318,8	490 313,5	100,0
Региональный проект «Спорт - норма жизни (Иркутская область)»				
8011103542P572997521	Субсидии местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	800,0	800,0	100,0
8141102544P551391522	Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	213 187,9	138 658,5	65,0
Региональный проект «Дорожная сеть»				
8350409631R15390F523	Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	353 760,3	353 760,2	100,0
8350409632R15390F523		168 765,7	168 765,7	100,0
8140409631R153931523	Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	165 621,3	165 621,3	100,0
8350409631R153931523		874 027,9	873 973,1	100,0
8350409632R153931523		708 755,8	632 874,0	89,3
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»				
835040966BR309700521	Повышение безопасности дорожного движения	12 601,1	10 599,7	84,1

Распределение средств РП на 01.01.2022 между МО Иркутской области (тыс.р.)

Наименование МО	План	Факт	% исп
Алексеевское городское поселение	1 177,6	1 177,6	100,0
Алехинское сельское поселение	1 974,2	1 974,2	100,0
Алзамайское городское поселение	7 261,3	7 261,3	100,0
Ангарский городской округ	684 399,8	562 587,5	82,2
Байкальское городское поселение	111 264,6	109 104,1	98,1
Балаганский муниципальный район	9 753,3	9 753,3	100,0
Балаганское сельское поселение	1 233,3	1 233,3	100,0
Баяндаевский муниципальный район	10 854,9	9 126,2	84,1
Белореченское городское поселение	9 609,3	5 076,4	52,8
Бельское сельское поселение	924,5	924,5	100,0
Бирюсинское городское поселение	4 867,7	4 867,7	100,0
Бодайбинское городское поселение	57 021,4	57 021,4	100,0
Большееланское сельское поселение	3 707,7	2 122,8	57,3
Братский муниципальный район	37 105,2	37 105,2	100,0
Бугульдейское сельское поселение	100,0	100,0	100,0
Веселовское сельское поселение	1 088,1	1 088,1	100,0
Видимское городское поселение	1 184,0	1 184,0	100,0
Вихоревское городское поселение	68 762,7	63 097,3	91,8
Голуметское сельское поселение	1 628,2	1 628,2	100,0
Городской округ Братск	1 665 629,5	1 222 005,6	73,4
Городской округ Зима	120 221,2	120 221,2	100,0
Городской округ Иркутск	12 929 594,1	6 089 280,2	47,1
Городской округ Саянск	226 622,2	222 051,6	98,0
Городской округ Свирск	79 182,1	33 113,3	41,8
Городской округ Тулун	270 629,3	51 243,8	18,9
Городской округ Усолье-Сибирское	541 138,0	541 138,0	100,0
Городской округ Усть-Илимск	54 095,0	43 803,4	81,0
Городской округ Черемхово	684 157,4	245 088,4	35,8
Еланцынское сельское поселение	1 868,8	0,0	0,0
Ербогаченское сельское поселение	1 335,3	1 335,3	100,0
Железногорск-Илимское городское поселение	143 544,8	143 544,8	100,0
Железнодорожное городское поселение	3 456,9	3 456,9	100,0
Железнодорожное сельское поселение	4 620,1	2 834,3	61,3
Жигаловское муниципальное образование	3 405,5	3 405,5	100,0
Заларинское городское поселение	48 341,6	48 341,6	100,0
Залогское сельское поселение	100,0	100,0	100,0
Знаменское сельское поселение	100,0	100,0	100,0
Зулумайское сельское поселение	50,0	50,0	100,0
Икейское сельское поселение	869,6	869,6	100,0
Иркутский муниципальный район	883 498,6	877 284,0	99,3
Иркутское сельское поселение	3 060,4	1 965,9	64,2
Каразейское сельское поселение	738,8	407,2	55,1
Карлукское сельское поселение	55 384,2	3 971,7	7,2
Карымское сельское поселение	2 984,2	1 584,2	53,1
Качугское городское поселение	3 635,3	3 635,2	100,0
Квитокское городское поселение	2 175,7	2 175,7	100,0
Киренский муниципальный район	460,2	460,2	100,0
Киренское городское поселение	66 652,0	61 937,0	92,9
Куйтунское городское поселение	8 267,0	3 954,2	47,8
Култуковское городское поселение	58 694,7	58 694,7	100,0
Куретское сельское поселение	100,0	100,0	100,0
Лесогорское городское поселение	3 112,7	3 112,7	100,0
Магистральнинское городское поселение	3 218,7	3 218,7	100,0
Макаровское сельское поселение	47 801,3	47 801,3	100,0
Мамонское сельское поселение	50,0	50,0	100,0

Наименование МО	План	Факт	% исп
Мамское городское поселение	70 837,8	41 101,0	58,0
Марковское городское поселение	18 008,4	18 008,4	100,0
Масляногорское сельское поселение	200,0	200,0	100,0
Михайловское городское поселение	4 174,5	4 174,5	100,0
Мишелевское городское поселение	7 952,1	4 468,3	56,2
Молодежное сельское поселение	6 465,9	6 465,9	100,0
Невонское сельское поселение	50,0	50,0	100,0
Нижнеилимский муниципальный район	10 000,0	10 000,0	100,0
Нижнеудинский муниципальный район	46 184,2	46 184,2	100,0
Нижнеудинское городское поселение	1 079 225,4	563 475,1	52,2
Никольское сельское поселение	3 432,3	3 432,3	100,0
Новобирюсинское городское поселение	2 713,0	2 713,0	100,0
Новожилкинское сельское поселение	1 511,3	1 511,3	100,0
Новоигирминское городское поселение	4 704,6	4 704,6	100,0
Новомальтинское сельское поселение	1 316,9	1 316,9	100,0
Оекское сельское поселение	3 750,0	3 750,0	100,0
Олхинское сельское поселение	2 434,5	1 700,0	69,8
Ольхонский муниципальный район	2 291,0	2 291,0	100,0
Перфиловское сельское поселение	100,0	100,0	100,0
Прибрежнинское сельское поселение	1 883,6	1 883,6	100,0
Раздольинское сельское поселение	661,8	661,8	100,0
Речушинское сельское поселение	1 493,8	1 493,8	100,0
Рождественское сельское поселение	25 603,5	25 603,5	100,0
Рудногорское городское поселение	1 347,2	1 347,2	100,0
Сельское поселение Александровское	492,6	492,6	100,0
Сельское поселение Баяндай	3 955,1	3 955,1	100,0
Сельское поселение Бильчир	50,0	50,0	100,0
Сельское поселение Бохан	3 884,3	3 884,3	100,0
Сельское поселение Гаханское	747,7	747,7	100,0
Сельское поселение Иваничевск	100,0	100,0	100,0
Сельское поселение Казачье	50,0	50,0	100,0
Сельское поселение Каменка	100,0	100,0	100,0
Сельское поселение Кутулик	3 173,5	3 173,5	100,0
Сельское поселение Ново-Ленино	771,0	771,0	100,0
Сельское поселение Новонукутское	3 224,3	3 224,3	100,0
Сельское поселение Олонки	100,0	100,0	100,0
Сельское поселение Оса	4 919,3	4 919,3	100,0
Сельское поселение Тихоновка	200,0	200,0	100,0
Сельское поселение Тургеневка	5 000,0	5 000,0	100,0
Сельское поселение Укыр	50,0	50,0	100,0
Сельское поселение Усть-Ордынское	10 149,0	10 148,4	100,0
Слюдянский муниципальный район	2 654,8	2 654,8	100,0
Слюдянское городское поселение	107 364,5	107 364,5	100,0
Сосновоборское сельское поселение	56 645,0	56 645,0	100,0
Сосновское сельское поселение	2 687,2	1 861,9	69,3
Среднинское городское поселение	6 397,2	3 909,9	61,1
Тайтурское городское поселение	28 188,1	25 314,7	89,8
Тайшетский муниципальный район	92 640,8	92 640,8	100,0
Тайшетское городское поселение	108 776,9	108 776,9	100,0
Тангуйское сельское поселение	1 034,0	1 034,0	100,0
Тельминское городское поселение	1 436,1	0,0	0,0
Тулунский муниципальный район	100,0	100,0	100,0
Тыретское городское поселение	22 329,0	22 329,0	100,0
Ульканское городское поселение	2 621,6	2 621,6	100,0
Уриковское сельское поселение	7 236,1	7 236,1	100,0
Усольский муниципальный район	14 957,4	11 940,6	79,8
Усть-Илимский муниципальный район	10 291,6	10 291,6	100,0
Усть-Кудинское сельское поселение	1 563,0	1 563,0	100,0
Усть-Кутский муниципальный район	3 570,2	3 570,2	100,0

Наименование МО	План	Факт	% исп
Усть-Кутское городское поселение	26 614,4	26 614,4	100,0
Усть-Удинский муниципальный район	3 423,5	3 423,5	100,0
Усть-Удинское сельское поселение	3 763,5	3 763,5	100,0
Уховское сельское поселение	344,9	0,0	0,0
Ухтуйское сельское поселение	150,0	150,0	100,0
Ушаковское сельское поселение	971,5	971,5	100,0
Ханжиновское сельское поселение	714,0	714,0	100,0
Харбатовское сельское поселение	50,0	50,0	100,0
Холмогойское сельское поселение	100,0	100,0	100,0
Хомутовское сельское поселение	47 421,8	47 421,8	100,0
Хужирское сельское поселение	100,0	100,0	100,0
Черемховский муниципальный район	100,0	100,0	100,0
Чунское городское поселение	169 906,8	159 202,0	93,7
Шелеховский муниципальный район	18 094,4	18 094,4	100,0
Шелеховское городское поселение	367 435,3	202 128,2	55,0
Шерагульское сельское поселение	1 791,2	1 791,2	100,0
Юртинское городское поселение	1 546,8	1 546,8	100,0
Янтальское городское поселение	3 333,2	3 333,2	100,0
Итого	21 382 376,4	12 431 731,3	58,1
